Український Католицький Університет

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК

Проектний Менеджмент в IT
Лекція 3

Ярослав Олексюк

2026-10-05

Документ:

YO-NK01-D103_02

ЗМІСТ

1 Учасники Проекту

2 Проектна Команда

3 Комунікація

1 Учасники Проекту

1. Клієнт і Постачальник
2. Стейкхолдери
3. Проектні Ролі

1 1 Клієнт і Постачальник




- Хто актий Клієнт / Замовник ?
- Хто такий Постачальник / Виконавець ?
- Як можна класифікувати Клієнтів та Постачальників ?
- Хто у Проекті працює з Клієнтом ?

1.1 Клієнт і Постачальник

1. Визначення
2. Ієрархія
3. Співпраця

1 1 1 Клієнт і Постачальник. Визначення



Клієнт
Customer

Клієнти і Постачальники (Замовники і Виконавці):

- ✓ **Клієнти, Замовники / Clients, Customers** – це ті, **для кого виконується** Проект чи його частини
- ✓ **Постачальники, Виконавці / Suppliers, Vendors** – це ті, **хто виконує** Проект чи його частини
- ✓ Це окремі люди, організації
- ✓ Види Клієнтів та Постачальників:
  - ✓ **Зовнішні** – поза нашою Організацією
  - ✓ **Внутрішні** – організаційні одиниці нашої Організації
- ✓ Клієнти пов'язані із поняттям «Стейкхолдери», хоч саме воно ширше




- ❖ **Відповідати Очікуванням Клієнтів** – це головна ціль Проекту
- ❖ Клієнтам часто потрібно **допомогти формулювати реалістичні Очікування**
- ❖ **Кінцеві Очікування** повинні бути сформульовані у **співпраці** Клієнтів (Замовників) і Постачальників (Виконавців), – Постачальники часто **володіють спеціалізовними знаннями** на вищому від Клієнтів рівні

1 1 2 1 Клієнт і Постачальник. Ієрархія 1

Співпраця
Клієнт - Постачальник
(Замовник - Виконавець):

- ✓ У великих Проектах зазвичай будується **багаторівнева структура** Клієнт-Постачальник
- ✓ При цьому один учасник процесу **може бути і Клієнтом, і Постачальником,** залежно від контексту

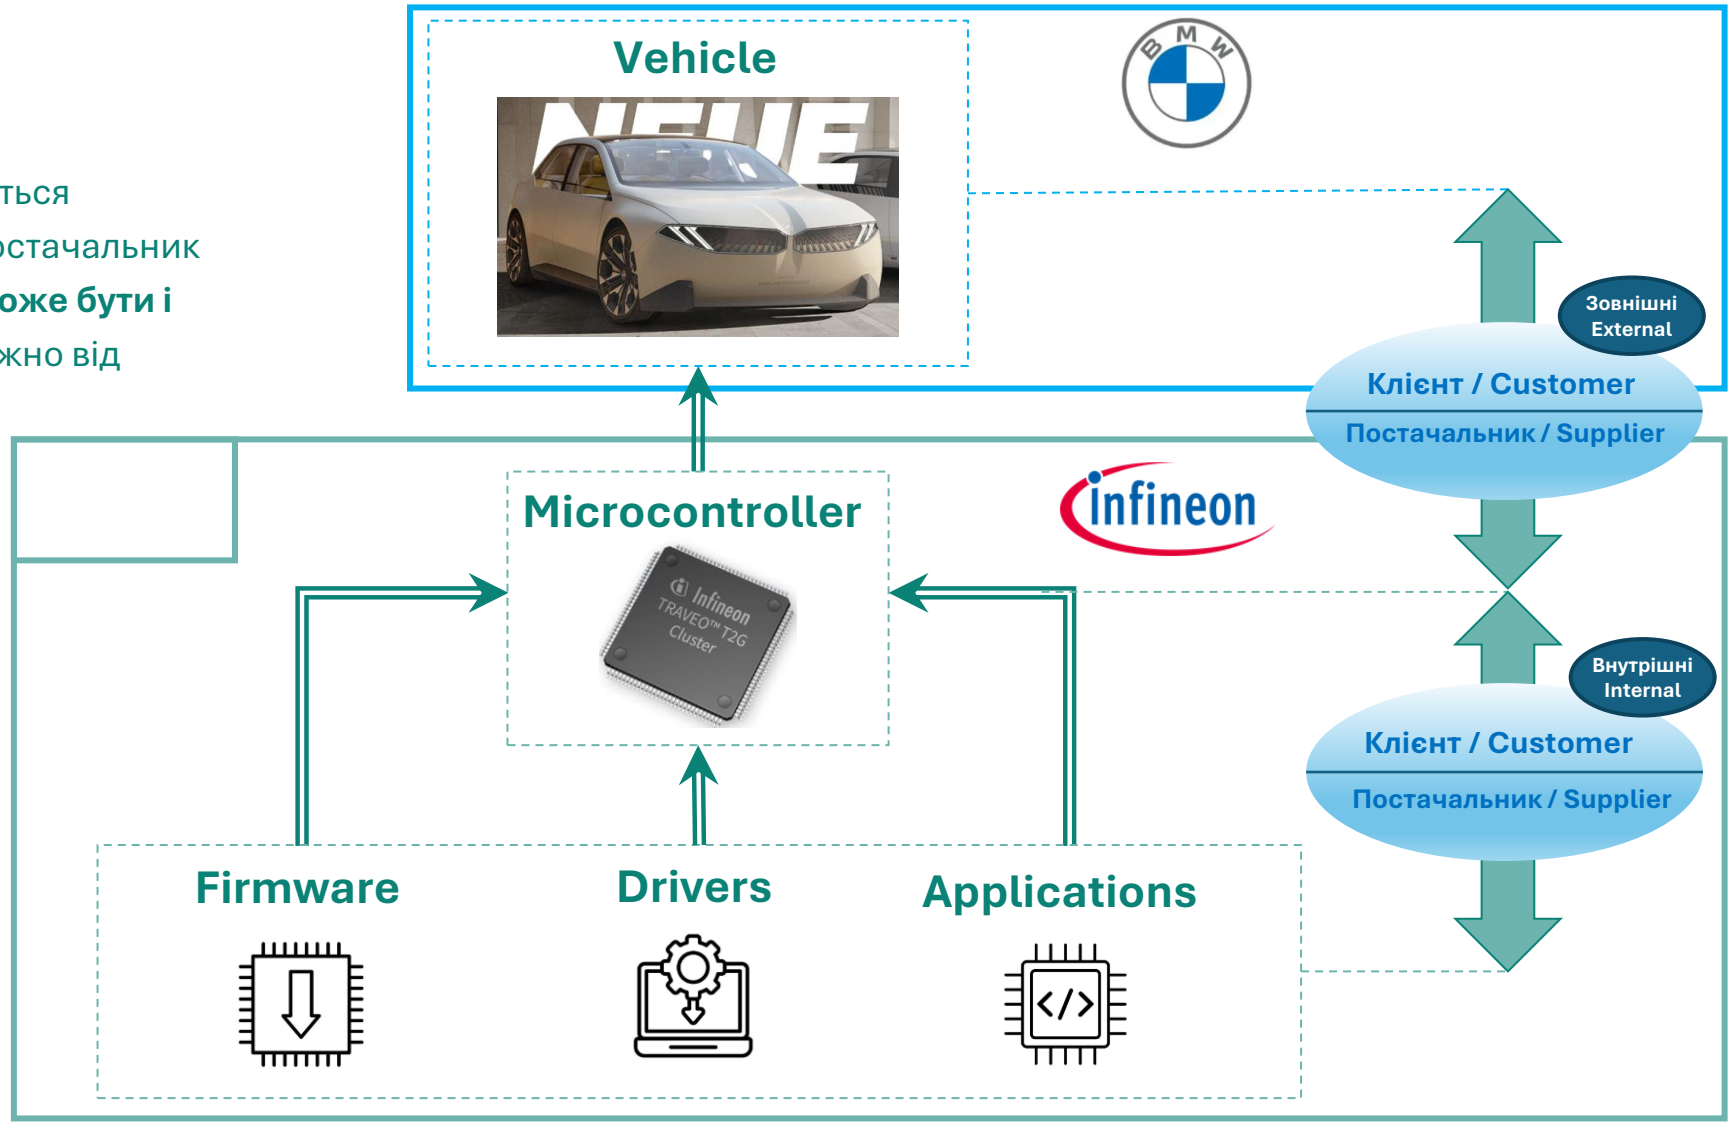

1 1 2 2 Клієнт і Постачальник. Ієрархія 2

- ✓ У Промисловості часто говорять про **ієрархію Клієнтів та Постачальників:**
  - ✓ **OEM (Original Equipment Manufacturer)** – виробник **кінцевого Продукту**
  - ✓ **Постачальник 1-го рівня / Tier 1 Supplier** – Постачальник, котрий надає свої Продукти безпосередньо до OEM
  - ✓ **Постачальники 2+ рівнів / Tier 2 Supplier, Tier 3 Supplier etc** – Постачальники, котрі надають свої Продукти до Tier 1, Tier 2 тощо
- ✓ Часто одна Організація **може бути на різних рівнях** цієї структури залежно від контексту


Автомобіль
Vehicle



Рішення ADAS
ADAS Solution




Електроніка
Electronics




ПЗ
Software



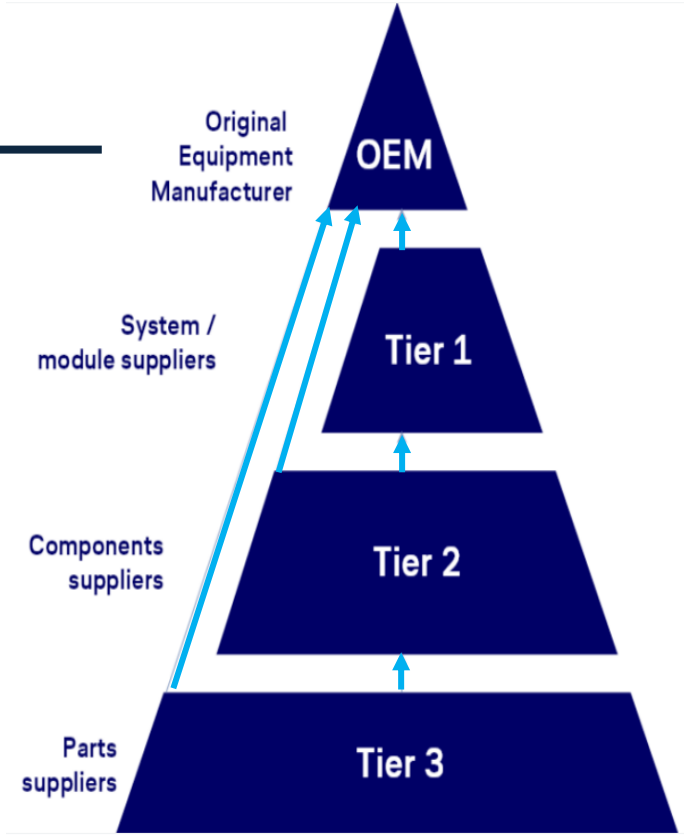


1 1 3 Клієнт і Постачальник. Співпраця

- ✓ Залежно від **умов та розміру Організації та Проекту**, співпраця може налагоджуватися різними шляхами
- ✓ Чим **більша Організація**, тим більше **посередників** між Проектом і Клієнтом
- ✓ **У великих Організаціях** звернення до/від Клієнта (Зміни, Проблеми тощо) здійснюються відповідно до **визначених Процесів** та здебільшого мають бути **зареєстровані** у **спеціальному інструметарії**

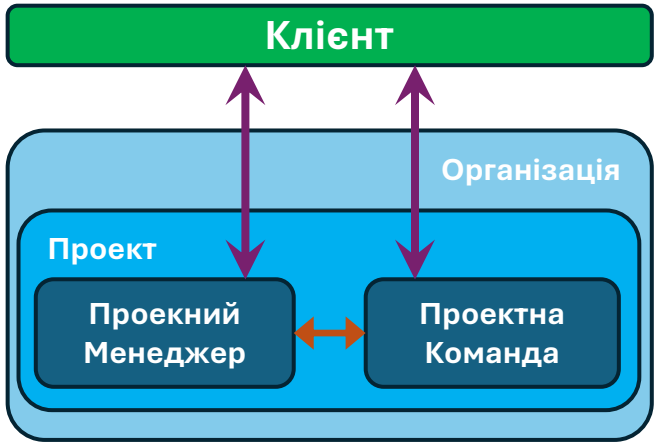


Безпосередня Співпраця

- ПМ і Команда спілкуються безпочередньо із Клієнтом
- Малі Організації та Проекти

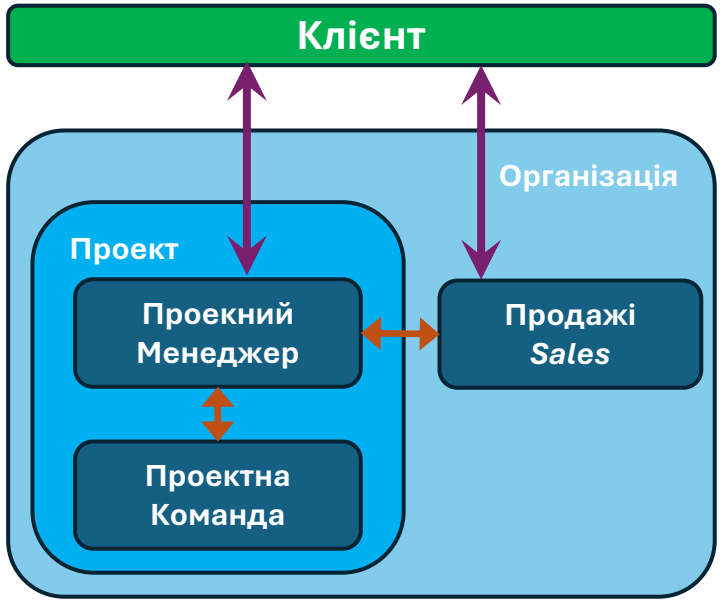

Проектна Співпраця

- Спілкування з Клієнтом через ПМ'а і і Відділ Продажів
- Середні Організації та Проекти

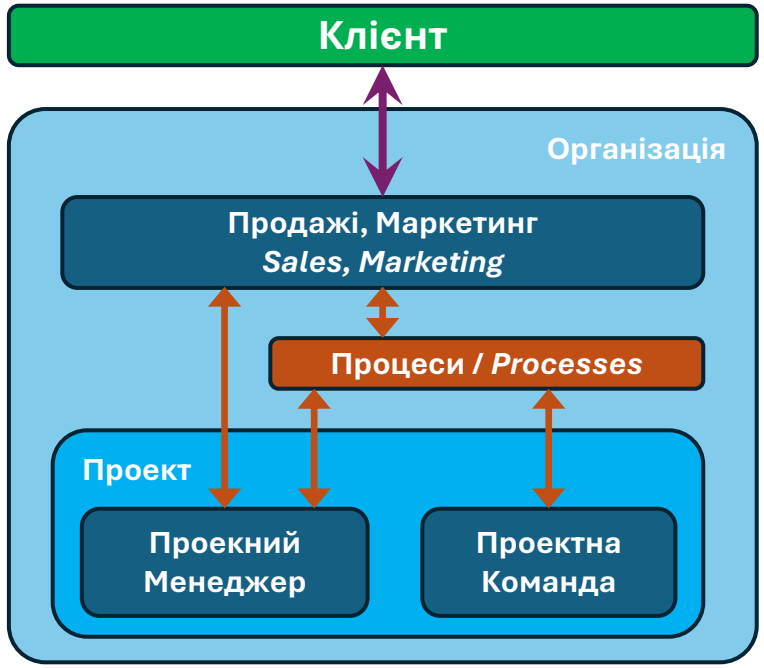

Процедурна Співпраця

- Спілкування з Клієнтом через спеціалізовані Відділи: Продажів, Маркетингу тощо
- Звернення до/від Клієнта – через Процеси та реєстрацію у відповідних інструментах
- Великі Організації та Проекти

1 2 Стейкхолдери



- Хто такі Стейкхолдери ?
- Хто належить до Стейкхолдерів ?
- Як ПМ та Команда мають працювати зі Стейкхолдерами ?

1 2 Стейкхолдери

1. Визначення
2. Огляд
3. Робота зі Стейкхолдерами

1 2 1 Стейкхолдери. Визначення

«***Зацікавлені сторони / акціонери, стейкхолдери**: **Особи або групи**, які **мають інтерес до проекту** (або його результатів), **можуть впливати** на нього або **зазнають його впливу** (чи його результатів).»*

*"**Interested parties / stakeholders: Individuals or groups** that **have an interest** in, **can influence**, or **are impacted by** the **project** (or its outcome)."*

IPMA – ICB4.0 (2015)

«***Зацікавлена сторона**: **особа, група або організація**, яка **може впливати** на рішення, діяльність або результат проекту, програми чи портфеля, **зазнавати їхнього впливу** або **вважати**, що зазнає такого впливу.»*

"***Stakeholder**: **An individual, group, or organization** that **may affect**, **be affected by**, or **perceive itself to be affected by** a decision, activity, or outcome of a project, program, or portfolio."*

PMI - PMBOK Guide 7th edition (2020)

❖ Поширеним є **ототожнення Клієнтів та Стейкхолдерів**, проте останнє поняття є **ширшим** та охоплює власне **Клієнтів**, а також **багато інших Зацікавлених Сторін**: Керівництво Організації, суміжні Проекти (із котрими є взаємозв'язки), органи стандартизації тощо.

1 2 2 Стейкхолдери. Огляд

✓ Розрізняють **Внутрішніх** та **Зовнішніх Стейкхолдерів**, заолежно від того, чи вони перебувають у нашій **Організації**, чи поза нею



1 2 3 Стейкхолдери. Робота

- ✓ Проектний Менеджер може створити та опрацьовувати:
  - ✓ **Реєстр Стейкхолдерів / Stakeholders Register**
  - ✓ **План Залучення Стейкхолдерів / Stakeholders Engagement Plan**
- ✓ Ці документи зазвичай містять:
  - ✓ Перелік **ідентифікованих** Стейкхолдерів
  - ✓ Опис **зацікавленості** та **залученості** кожного Стейкхолдера
  - ✓ **Стратегія** роботи із кожним Стейкхолдером

Реєстр Стейкхолдерів (приклад)

№	Назва	Участь	Вид	Зацікавленість в успіху Проекту	Вплив	Конфіліктність	Стратегія Комунікації
1.	**Клієнт**	Замовлення Продукту Спонсорування Проекту	Зовнішній	Висока	Високий	Висока	Залученість
2.	**Спонсор Проекту**	Нагляд за перебігом Адміністравтина підримка	Внутрішній	Висока	Високий	Низька	Залученість
3.	**Постачальники**	Продаж Обладнання Отмання Контрактів	Зовнішній	Середня	Низький	Висока	Контроль
4.	**ПМО**	Нагляд за Процесами Процедурна підтримка	Внутрішній	Висока	Середній	Середня	Залученість
5.	**Зовнішні Аудитори**	Контроль Процесів Сертифікація	Зовнішні	Низька	Високий	Висока	Діалог

❖ Важливо **ідентифікувати Стейкхолдерів**, правильно **оцінити** їхні **Участь і Вплив**, опрацювати відповідну **Стратегію роботи** з ними, та **регулярно оновлювати** усі ці дані.

13 Проектні Ролі

1. Визначення
2. Матрична Організація

1 3 1 Проектні Ролі. Визначення

- ✓ Усі Учасники Проекту виконують певні визначені **Ролі**
- ✓ **Роль** – це набір **Фукнціоналу**, **Повноважень** та **Відповідальності** та необхідних **Компетенцій**, визначених **у контексті Проекту**
- ✓ Проектний Менеджер формулює Ролі, ґрунтуючись на Процесах Організації у таких документах:
  - ✓ **Командна Сітка / Team Roster** – у межах Проектної Комнади
  - ✓ **Реєстр Стейкхолдерів / Stakeholders Register, План Залучення Стейколдерів / Stakeholders Engagement Plan** - поза Проектною Командою
- ✓ На підставі Ролей підбирать людей – **Виконавців**
- ✓ Сам **Проектний Менеджер (ПМ)** виконує свою Роль відповідно до Процесу в Організації

1 3 2 Проектні Ролі. Матрична Організація

- ✓ **Проектний Менеджер** може мати різний набір **Повноважень та Обов'язків** залежно від Процесів Організації
- ✓ **Матрична Організація / Matrix Organization** – поширена організаційна структра із розділеними описаними вище Повноваженнями між ПМ'ом та Функційним Менеджером:
  - ✓ **Проектний Менеджер / Project Manager** – відповдіає за Проект та роботу Команди у ньому
  - ✓ **Фукнційний (Лінійний) Менеджер / Functional (Line) Manager** – відповідає за Спеціалістів для Проектної Команди, їхній розвиток, адміністративні аспекти; зазвичай Команди ФМ'ів сформовані за принципом **спеціалізації**, наприклад: Системна Інженерія, Розробка, Тестування, Дизайн тощо
  - ✓ Для створення Проектної Команди Проектний Менеджер робить запит до Функційних Менеджерів для надання Спеціалістів до визначених у Проекті Ролей
- ✓ Розрізняють **Сильну**, **Збалансовану** та **Слабку Матриці**, де повноваження ПМ'а змінюються від практично повного контролю Проекту та Команди до ролі **Проектного Координатора / Project Coordinator**

Сильна Матриця Strong Matrix	Збалансована Матриця Balanced Matrix	Слабка Матриця Weak Matrix
• **ПМ** відповідає за **Проект і Команду** • **ПМ приймає кадрові рішення**, бере людей до Проекту • **ФМ має допоміжну роль** запевення Компетенцій для людей, котрих беруть до Проекту	• **Повноваження** ПМ'а та ФМ'а **збалансовані** • ПМ відповідає за **Проект** • ПМ має **узгоджувати кандидатури** людей до Команди із ФМ'ами	• ПМ є фактично **Проектним Координатором**: організація роботи, фасилітація тощо • **ПМ отримує** Бюджет, План, Обсяг, котрих має дотримуватися • **ФМ'и надають людей** для Проекту та контролюють кадрові питання

2 Проектна Команда



Як визначити склад Проектної Команди ?

Хто потрібний у Проектній Команді ?

Хто має шукати людей та формувати Проектну Команду ?

Хто відповідає за розвиток Спеціалістів ?


2 Команда

1. Визначення і Структура
2. Компетенції та Розвиток
3. Залучення Спеціалістів


21 Проектна Команда. Визначення і Структура

- ✓ **Проектна Команда / Project Team**
  - ✓ **Група людей**, котра **виконує Проект**
  - ✓ Зазвичай повністю **підпорядкована Проектному Менеджерові**
  - ✓ Може **знаходити в одному місці** чи Організації, а може бути **розподіленою** між декількома місцями чи Організаціями
  - ✓ Може поділятися на **Підкоманди**, на чолі кожної з котрих стоїть **Лідер**
  - ✓ Аналогічно може бути створена **ієрархічна структура** Програмна Команда >> Проектна Команда >> Підкоманди


Команда із горизонтальною структурою

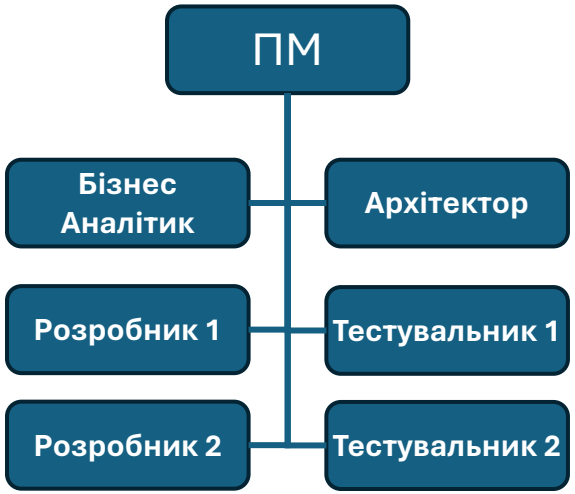

Команда із ієрархічною структурою

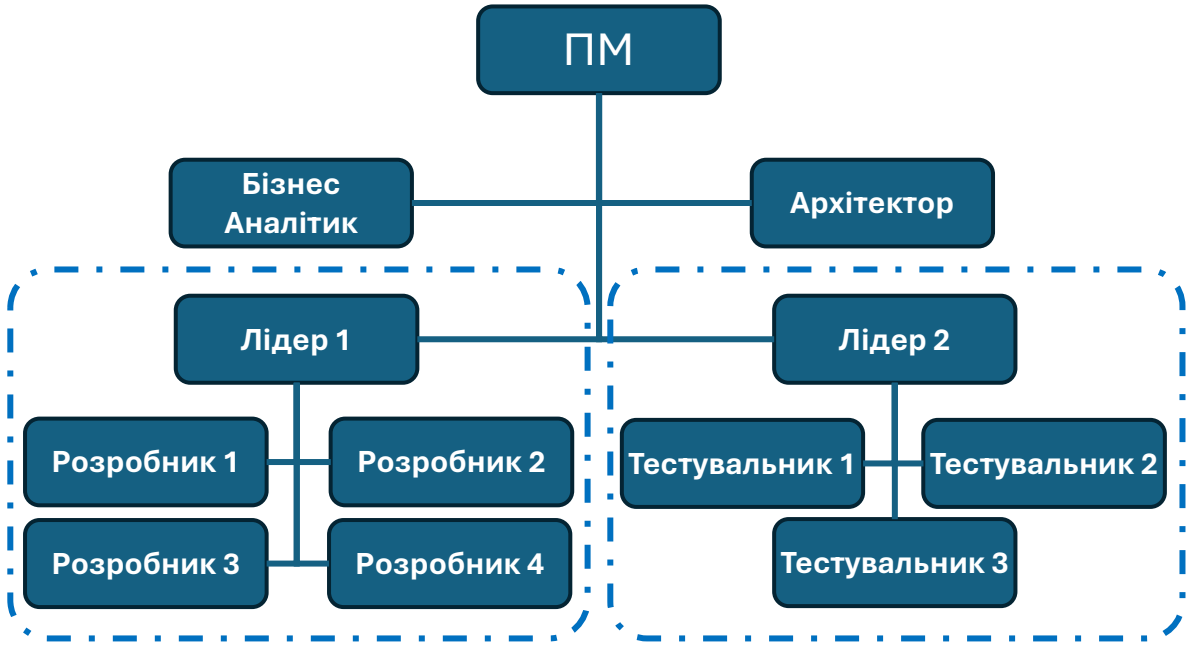

Програма із багаторівневою ієрархічною структурою

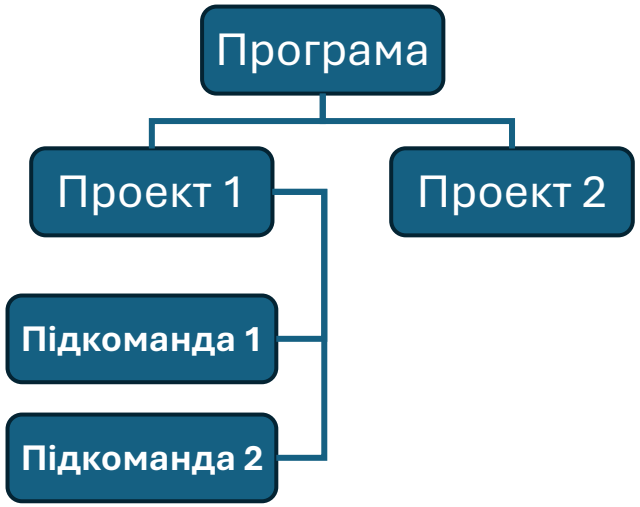

2 2 Проектна Команда. Компетенції та Розвиток

- ✓ **Кожній Ролі** у Проектній Команді відповіє набір **Компетенцій**, котрими повинен володіти Виконавець цієї Ролі
- ✓ **Проектний Менеджер** має сформулювати **потребу** в Спеціалістах із визначеними Компетенціями у таких документах:
  - ✓ **Командна Сітка / Team Roster**
  - ✓ **Матриця Компетенцій / Skills Matrix**
- ✓ За розвиток Комтепенцій Спеціалістів зазвичай відповідають **Функційні Менеджери**

Командна Сітка / Team Roster (приклад)

№	Роль	Рівень	Ім'я
1.	**ПМ**	Сеньор	<Ім'я_1>
2.	**Інженер Вимог**	Мідл	<Ім'я_2>
3.	**Архітектор**	Сеньор	<Ім'я_3>
4.	**Розробник Лід**	Сеньор	<Ім'я_4>
5.	**Розробник**	Мідл	<Ім'я_5>
6.	**Тестувальник Лід**	Сеньор	<Ім'я_6>
7.	**Тестувальник**	Мідл	<Ім'я_7>


Матриця Компетенцій / Skills Matrix (приклад)

№	Ім'я	Проект. Процеси	Інж. Вимог	Арх.	C/C++	Python
1.	<Ім'я_1>	5	1	1	-	-
2.	<Ім'я_2>	2	5	2	1	1
3.	<Ім'я_3>	2	4	5	5	2
4.	<Ім'я_4>	2	3	3	5	3
5.	<Ім'я_5>	2	2	2	5	2
6.	<Ім'я_6>	2	3	3	3	5
7.	<Ім'я_7>	2	2	2	2	5

Числа вказують на рівень володіння вказаною Компетенцією: 1 – ознайомчий; 2 – базой користувач; 3 - самостійнийкористувач; 4 – спеціаліст; 5 - експерт

2 3 Проектна Команда. Залучення Спеціалістів

- ✓ **Проектні Команди** є **ситуативними**, створюються та розпускаються для конкретного Проекту
- ✓ У деяких Організаціях, здебільшого великих і з тривалими Проектами та стабільними Продуктами, Команди досить **стабільні** і часто повністю чи майже співпадають із **Продуктовими Командами**
- ✓ Основні **джерела Виконавців** для Проектної Команди:
  - ✓ **Функційні Команди** (Розробники, тестувальники, Аналітики тощо) – підбір із людей, котрі вже працюють в Організації
  - ✓ **Рекрутинг** – залучення ззовні; тут Спеціалістів наймають під конкретний Проект, проте вони теж потрапляють до відповідної Функційної Команди на чолі із відповідним ФМ'мом
- ✓ У кожному з цих випадків **ПМ** може чи повинен (залежно від Процесу) **брати участь у співбесідах**

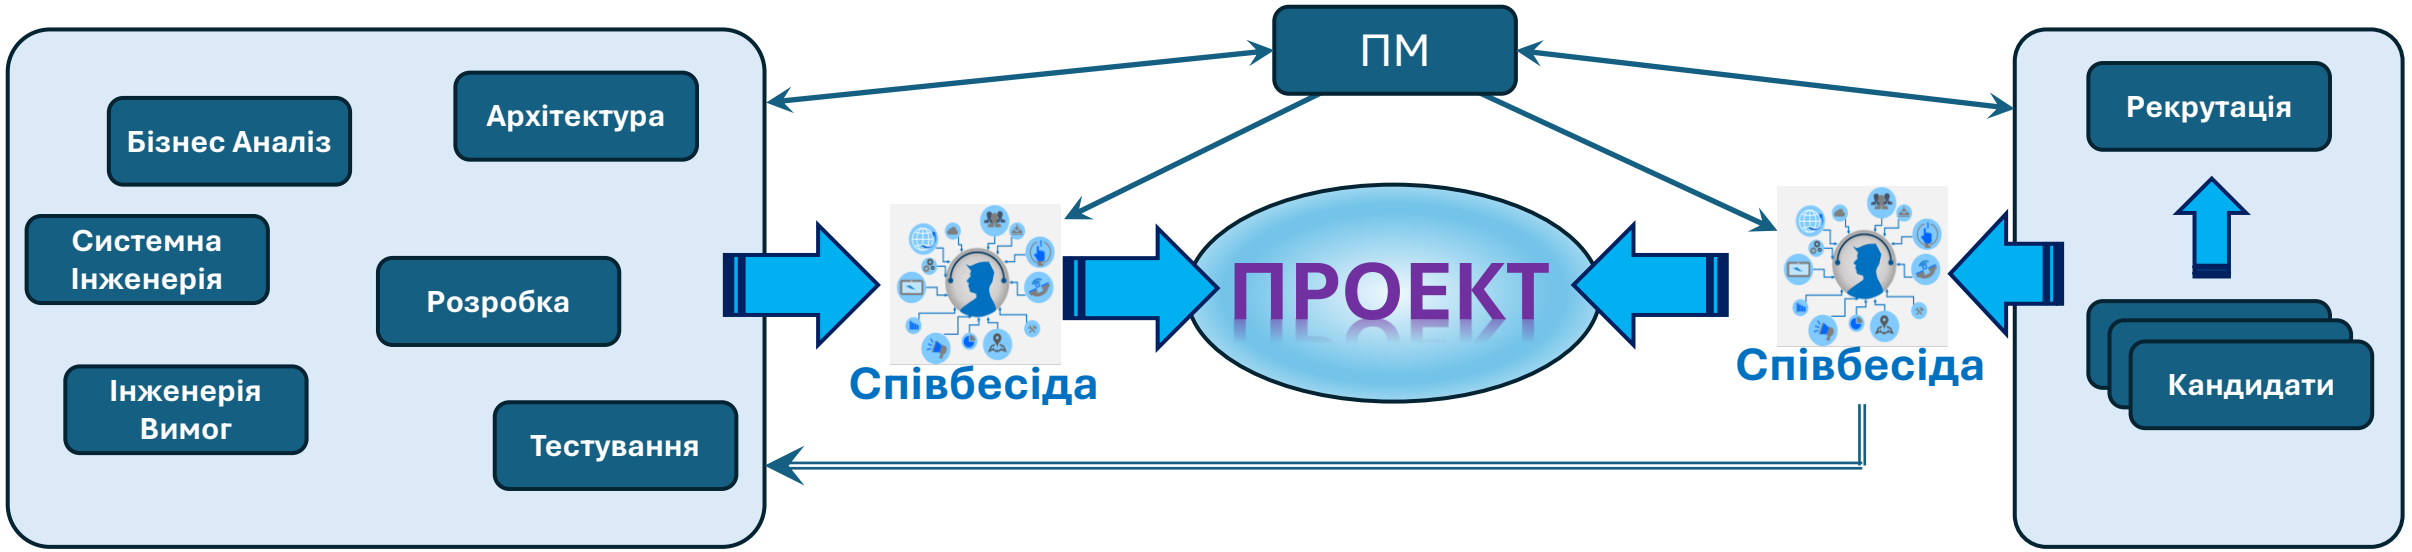

❖ **Межі** між Продуктовою та Проектною Командами часто можуть бути нечіткими, зокрема коли **ті самі люди** задіяні **у різних Проектах**, але усі опрацьовують приблизно **той самий Продукт**

3 Комунікація



- Яке місце спілкування у Проекті ?
- Що важливо для правильного передавання інформації ?
- Де, хто та яку інформацію має передавати у Проекті ?

3 Комунікація

1. Визначення
2. Характеристики
3. Способи та Інструменти
4. Ескаляція
5. Звітність
6. План Комунікації

3 1 Комунікація. Визначення

Комунікація / Communication:

- ✓ Це **спілкування між Учасниками Проекту**, **поширення** та **опрацювання інформації**
- ✓ **Інформація** не може залишатися без руху
- ✓ Чим **складніший Проект**, тим важливіше **повідомляти** про те, що відбувається **відразу**
- ✓ Коли виникають **труднощі** із виконанням, потрібно **консультуватися**
- ✓ **Важлива інформація** повинна бути **задокументованою**
- ✓ **Керівник Проекту / Project Manager** відіграє **провідну роль** у налагодженні та підтриманні Комунікації у Проекті:
  - ✓ **Поширення ключової інформації** про Проект, його планування, статус, проблеми
  - ✓ Спілкування зі **Стейкхолдерами**
  - ✓ Організація **каналів поширення** інформації
  - ✓ Запевнення **Інструментарію**
  - ✓ Визначення **контактів для конкретних тем** у межах Команди та поза нею
  - ✓ Створення **Проектного Плану Комунікації / Project Communication Plan**

❗ ❖ У Проекті має бути сформульований **Проектний План Комунікації (Proejct Communication Plan)**: хто, що, кому, як часто повідомляє

3 2 Комунікація. Характеристики

- ✓ Для дотримання **ефективності Комунікація** повинна відповідати певним **критеріям**
- ✓ У Проекті Комунікація повинна бути структурованою із визначеними каналами спілкування для різних видів:
  - ✓ **Регулярна / Regular** – запланована відповідно до організації роботи Проекту, має бути описана у **Проектному Плані Комунікації**
  - ✓ **За Потреби / On Demand, Ad Hoc** – для вирішення окремих тем, не запланованих; основні канали для такої комунікації мають бути описані у **Проектному Плані Комунікації**





- ❖ Про **Зміни** та **Проблеми** потрібно **повідомляти відразу**
- ❖ При виникненні проблем потрібно **шукати рішення, а не винних**
- ❖ Важливою є **вчасність** комунікації
- ❖ Часто важлими є **Зворотній Зв'язок**, принаймні **підтвердження** отримання та зрозуміння повідомлень

3 3 Комунікація. Способи та Інструменти

- ✓ **Вибір Способів та Інструментарію Комунікації:**
  - ✓ У більшості випадків Учасники Проекту вибирають **найзручніший** у конкретній ситуації
  - ✓ Для регуляного спілкування (командні синки, статус мітинги тощо) визначаються у Плані Комунікації
  - ✓ Існують ситуації, коли **Процес вимагає використання певних Інструментів**, зокремма для документування таких об'єктів:
    - ✓ **Звіти / Reports**
    - ✓ **Зміни / Changes**
    - ✓ **Проблеми / Issues**
    - ✓ **Ескалації / Escalations**



❖ Процес та Інструмтентарій стандартних ситуацій, як **Зміни, Проблеми**, зазвичай описані у **Плані Конфігурації Проекту / Project Configuration Plan** та **Плані Керування Змінами Проекту / Project Change Management Plan** (деколи ці документи можуть бути об'єднані)

3 4 Комунікація. Ескалація

- ✓ **Ескалація / Escalation**
  - ✓ **Перенесення Проблеми на вищих організаційний рівеннь**
  - ✓ Зазвичай це звернення до вищого Керівництва у таких випадках:
    - ✓ Потрібне **рішення поза повноваженнями Проджект Менеджера**
    - ✓ Потрібні **додаткові Ресурси**
- ✓ **Ескалаційний Шлях / Escalation Path**
  - ✓ Це **схеми зверення** до Керівництва у випадку Ескалації
    - ✓ **Хто, до кого, у яких випадках** може ескалювати
  - ✓ Мають бути визначені для Проекту
  - ✓ Можуть бути окремим документом або як частина Проектного Плану Комунікації
  - ✓ Формулює **Рівні Ескалації / Escalation Levels** відповідно до структури Проекту та Організації



- ❖ **Ескалацією** часто **зловживають** для чинення тиску на інших Учасників Проекту
- ❖ Варто чітко **сформулювати ситуації**, коли можна ескалювати, наприклад: Рішення поза повноваженнями ПМ’а; необхідні додаткові Ресурси (людські, матеріальні тощо)
- ❖ Важливо **не оминати** необхідні **Рівні Ескалації**

3 5 Комунікація. План

- ✓ **Проектний План Комунікації / Project Communication Plan:**
  - ✓ Проектний документ, за котрий **відповідає Проджект Менеджер**
  - ✓ Описує **шляхи, способи, частоту регулярного спілкування**
  - ✓ Подає **шляхи** для **нерегулярного спілкування**

План Проектної Комунікації / Project Communication Plan (приклад)

№	Подія	Спосіб Інструмент	Частота	Організатор	Учасники	Надавана Інформація
1.	**Планування Проекту** ***Project Planning***	Офлайн Офіс	Щомісяця *Monthly*	ПМ	ПМ Лідери Команда	Епіки, Сторі *Epics, Stories*
2.	**Синк Команди** ***Team Synch***	Онлайн Teams	Пон, Сер, П'ят *Mon, Wed, Fri*	ПМ	ПМ Лідери Команда	Таски, Сабтаски *Tasks, Subtasks*
3.	**Координаційна Нарада Steering Meeting**	Онлайн Teams	Щотижня *Weekly*	Проджект Оунер (ПО) *Project Owner (PO)*	ПМ ПО Продажі Якість ПМ'и суміжних Проектів	Статус Проекту *Project Status* Критичні Проблеми *Critical Issues*
4.	**Узгодження з Клієнтом** ***Customer Alignment***	Онлайн Teams	Кожних 2 Тижні *Biweekly*	Менеджер Продажів (МП) *Sales Manager* (SM)	МП ПМ Клієнт Представник Команди (за потреби)	Статус Проекту *Project Status*

3 6 Комунікація. Звітність

- ✓ **Проджект Менеджер відповідальний за регулярну Звітінсть**
  - ✓ **Статус** Проекту відносно Обсягу, Плану, Бюджету
  - ✓ Досягнення **проміжних Цілей** Проекту, **Майлстоунів**
  - ✓ Стан **Ризиків**
  - ✓ **Проблеми** та **Ескалації**
- ✓ Способи, регулярність та зміст Звітності зазвичай описуєтсья у **Проектному Плані Комунікації**
- ✓ Звітність може подаватися **поштою**, як **презентація** чи у **спеціалізованому середовищі**

Проектний Менеджмент в IT
Лекція 3

Дякую за увагу ☺
