Український Католицький Університет

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК

Проектний Менеджмент в IT
Лекція 1

Ярослав Олексюк

2026-09-07

Документ:

YO-NK01-D101_04

ЗМІСТ

1. Вступ
2. Основні Визначення
3. Життєвий Цикл Проекту

1 Вступ

1. Знайомство
2. Правила
3. Організація Курсу
4. Огляд Курсу
5. Термінологія
6. Джерела

1 1 Правила



Не розмовляємо



Питання можна задавати після кожного слайду
Піднімаємо руку, питаємо



Питання до аудиторії – для обговорення



Важлива інформація, котру варто запам’ятати

1 2 1 Про Себе

Ярослав Олексюк

Senior Manager, Systems Engineering

Infineon Technologies



- Актуальна робота – це керування групою із створення Automotive Microcontrollers Software / Firmware
- 20+ років досвіду в Автомобільній Промисловості
- Посади від Інженера-Конструктора до Керівника Інженерних Груп та Проектів
- Проектування Систем, Виробів
- Керування Проектами та Інженерними Групами
- Побудова Процесів

1 2 2 Про Себе



- Який у кого проектний досвід, як частина навчання чи паралельно з ним ?
- Наскільки знайомою є термінологія Проектного Менеджменту?

1 3 1 Організація Курсу. Графік Занять

- Графік:
  - **Понеділок, 6. пара (16:50…18:10) → 2 академічні години**
  - **Аудиторія ЦШ-203**
- Передбачено **15 занять**: Лекції та Практичні чергуватимуться
- У семестрі є **14 тижнів**, тож планується **1 заняття поза цим графіком** протягом семестру
- **Заняття**
  - **В аудиторії**, із допустимими відхилення за потреби (тривоги, проблеми з живленням тощо)
  - Якщо виникне потреба, **онлайн у Teams**
- **Розподіл академічних годин**:

Вид заняття	Загальна к-сть годин
Лекції	16
Практичні	14
Самостійна робота	60

1 3 2 Організація Курсу. Розподіл Балів

- **Звітність**:
  - Практичні: **Завдання** під час занять
  - Проект: Кожний студент отримає **Проект**, котрий потрібно буде виконати протягом семестру
  - Залік: **2 Мідтерми** – тести за підсумками половини семестру
- **Додаткові бали:** за активність під час Практичних та Лекцій
- **Академічна заборгованість**: Залік можна буде перездати протягом залікового тижня
- **Розподіл балів**:

Вид роботи	Максимальна кількість балів
Поточні контрольні роботи	30
Проект	40
Залік (2 Мідтерми)	30 (15+15)
Додаткові	10

1 3 3 Організація Курсу. Матеріали та Спілкування

- **Матеріали Курсу** будуть розміщуватися на Moodle
  - https://learn.ucu.edu.ua/
  - Детальнішу інформацію буде надано згодом
- **Спілкування**
  - **В аудиторії** – під час занять та консультацій за домовленістю
  - Онлайн – у **Teams**

14 Огляд Курсу

Тиждень-1	Тиждень-2	Тиждень-3	Тиждень-4	Тиждень-5	Тиждень-6	Тиждень-7	Тиждень-8
Лекція-1	Практика-1	Лекція-2	Практика-2	Лекція-3	Практика-3	Лекція-4	Практика-4
Вступ *Визначення*	*Отримання* *Проекту*	*Продукт* *Обсяг* *Вимоги*		*Учасники Проекту* *Комунікація*		*Переговори* *Оцінка* *Ресурси* *Фінанси* *Створення Проекту*	*Мідтерм-1*

Тиждень-9	Тиждень-10	Тиждень-11	Тиждень-12	Тиждень-13	Тиждень-14	Тиждень-15	Тиждень-16
Лекція-5	Практика-5	Лекція-6	Практика-6	Лекція-7	Практика-7	Лекція-8	Заборгованість
План *Ризики* *Конфігурація*		*Виконання* *Контроль* *Звітність* *Якість*		*Проблеми* *Документація* *Закриття* *Проекту*	*Здавання* *Проекту*	*Підсумок* *Мідтерм-2*	Ліквідація заборгованості

1 5 Термінологія

- У Курсі здебільшого застосовано **загальноприйняту** в Проектному Менеджменті термінологію
- Заважючи на відмінності визначень різних стандартів та процесів окремих організацій, термінологія також може відрізнятися

- Віддається **перевага українським термінам**, хоч паралельно вводяться **також англомовні**
- У Проектному Менеджменті **термінологія здебільшого англомовна**
- **Україномовні терміни** менше розвивалися, тому часто важко адекватно перекласти, проте нам **варто шукати українські відповідники** для розвитку нашої мови

16 Джерела

- ✓ Матеріали Курсу побудовано на основі **стандартів IPMA**, **PMI**, **ISO**, **ASPICE**, **SAFe** тощо, із доданим **досвідом** автора
- ✓ Саме комерційний досвід дозволяє добре **вибрати потрібні** у конкретній ситуації **стандарти** та **зразки**
- ✓ Для навчання та отримання довідок **варто читати першоджерела**:
  - ✓ Стандарти
  - ✓ Документи професійних об'єднань
  - ✓ Книги творців різних процесів, методик, бажано мовою оригіналу
- ✓ Можна приєднатися до **професійних об'єднань** (**PMI**, **IPMA**, **SAFe** тощо) і отримати доступ до багатьох матеріалів – це платно, але для студентів зазвичай існують знижки

International Project Management Association (IPMA)
https://ipma.world/

→ **IPMA standards – Individual Competence Baseline (ICB4)**
https://ipma.world/ipma-standards-development-programme/icb4/

Project Management Institute (PMI)
https://www.pmi.org/

→ **Project Management Book of Knowledge (PMBoK)**
https://www.pmi.org/standards/pmbok

Настанова до зводу знань з управління проєктами. Настанова PMBoK v.7
https://pmiukraine.org/pmbok7

Scaled Agile Framework (SAFe)
https://framework.scaledagile.com/

ISO 21500:2021 Project, programme and portfolio management — Context and concepts
https://www.iso.org/standard/75704.html

Automotive Software Process Improvement and Capability Determination (ASPICE)
https://vda-qmc.de/en/automotive-spice/

DIN 69901:2009 Project management - Project management systems
https://www.din.de/en/meta/search/61764!search?query=DIN+69901

2 Основні Визначення

1. Мотивація і Мета
2. Проект
3. Проектний Менеджмент
4. Проектний Менеджер
5. Організація
6. Філософія та Цінності

2 1 Мотивація і Мета

Мотивація

- **Добра організація** роботи є однією з головних ознак **професіоналізму**
- **Добра організація** роботи – це **половина успіху**
- **Малі кроки** ведуть до **великих результатів**
- **Загальне розуміння** принципів допомагає робити **правильні малі кроки**
- Немає потреби всюди винаходити щось нове, краще **використати досвід інших**

Мета

- Мати **розуміння принципів організації** керування проектною роботою
- Отримати розуміння **Проекту та його скдладових**
- Знати основи **Проектного Менеджменту**
- **Систематизувати** знання та основні концепцій
- Могти **просто пояснювати** складні речі
- Ознайомитися із **підходами та методиками**
- Впорядкувати **термінологію**

2 2 Проект



- Що таке Проект ?
- Яке визначення Проекту ?
- Які основні ознаки Проекту ?
- З чого складається Проект ?

2 2 1 Проект. Визначення

«***Проект*** *- це унікальне, комплексне та* ***одноразове починання****, яке характеризується* ***конкретною метою****, обмеженими* ***часовими рамками*** *та визначеним розподілом* ***ресурсів****.»*

"A ***project*** *is a unique, complex and* ***one-time endeavor****, which is characterized by a* ***specific goal****, a limited* ***timeframe****, and a specified allocation of* ***resources****."*

DIN 69901:2009-01

«***Проект*** *- це унікальне, тимчасове,* ***багатозадачне зусилля****, спрямоване на створення* ***нового продукту, послуги*** *або* ***результату*** *в межах визначеного* ***обсягу, часу, бюджету*** *та* ***якості****.»*

"*A* ***project*** *is a unique, temporary,* ***multi-task effort****, which aims to create a* ***new product, service*** *or* ***result****, within a defined* ***scope, time, budget*** *and* ***quality****."*

IPMA Competence Baseline (ICB) 4.0 (2015)

«***Тимчасова діяльність****, спрямована на створення* ***унікального продукту, послуги*** *або* ***результату****. Проект має визначену* ***дату початку та завершення*** *і здійснюється для досягнення* ***конкретної мети*** *або набору цілей.»*

"*A* ***temporary endeavor*** *undertaken to create a* ***unique product, service****, or* ***result****. A project has a* ***defined start and end date*** *and is undertaken to achieve a* ***specific goal*** *or* ***set of objectives****."*

PMI - PMBOK Guide 7th edition (2020)


2 2 2 Проект. Елементи




2 2 3 Програма та Портфіоліо

- ✓ Якщо Цілі та Продукт достатньо великі, виникає потреба у розділенні їх досягнення та реалізацію декількома Проектами
- ✓ **Програма / Programme** – це сукупність **Проектів зі спільними Цілями і/або Продуктами, котрі координуються між собою**
- ✓ У контексті **Програми** говорять про відповідні визначення:
  - ✓ Керування Програмами / **Програм Менеджмент / Programme Management**
  - ✓ Керівник Програми / **Програм Менеджер / Programme Manager**
- ✓ **Портфіоліо / Portfolio** – це **сукупність Програм та Проектів** в Організації, котрі не поєднані спільними Цілями і/або Продуктами, проте підпорядковуються **Стратегічним Цілям** Організації
- ✓ У контексті **Портфоліо** говорять про відповідні визначення:
  - ✓ **Керування Портфоліо / Портфоліо Менеджмент / Portfolio Management**
  - ✓ **Керівник Портфоліо / Портфоліо Менеджер / Portfolio Manager**

Приклад:

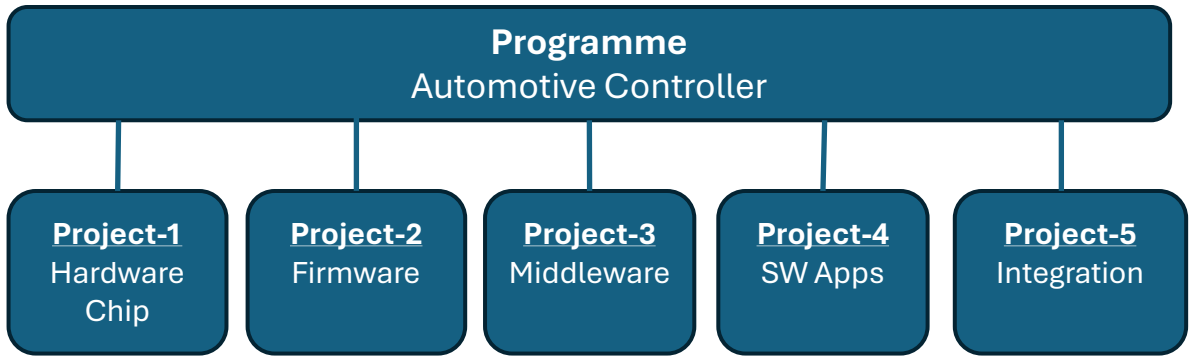

Приклад:

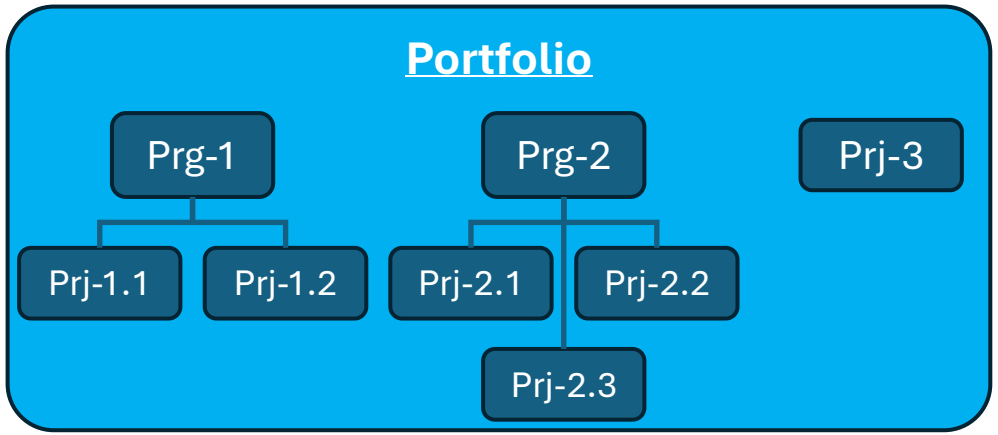

2 3 1 Проектний Менеджмент. Визначення

«***Керування проектами*** *— це* ***застосування методів, інструментів, методик*** *та* ***компетенцій*** *у рамках проекту. Воно передбачає* ***інтеграцію*** *різних етапів* ***життєвого циклу проекту***.»

“***Project management*** *is the* ***application*** *of* ***methods***, ***tools***, ***techniques*** *and* ***competencies*** *to a* ***project***.
It includes the ***integration*** *of the various phases of the* ***project lifecycle***.”

ISO 21500:2012

«***Керування проектами*** *полягає у* ***застосуванні методів, інструментів, методик*** *та* ***компетенцій*** *у рамках проекту для досягнення поставлених цілей.*»

"***Project management*** *is concerned with the* ***application*** *of* ***methods***, ***tools***, ***techniques*** *and* ***competences*** *to a project to achieve goals."*

IPMA Competence Baseline (ICB) 4.0 (2015)

«***Керування проектами*** *— це* ***практика ініціювання, планування, виконання, контролю*** *та* ***завершення*** *роботи команди з метою досягнення конкретних цілей та виконання визначених критеріїв успіху у встановлений термін.*»

"***Project management*** *is the* ***practice*** *of* ***initiating***, ***planning***, ***executing***, ***controlling***, *and* ***closing*** *the work of a team to achieve specific goals and meet specific success criteria at the specified time."*

PMI - PMBOK Guide 7th edition (2020)

2 3 2 Золотий Трикутник Проектного Менеджменту

- Трикутник **Обсяг – Час – Вартість** – одне із найважливіших визначень у проектному менеджменті:
  - **Обсяг** – що потрібно зробити
  - **Тривалість** – коли все має бути готовим
  - **Вартість** – скільки це все коштує
- У центрі має залишатися **Якість** як результат
- **Узгодження** та **оптимізація** за цими параметрами (із пріоритетністю відповідно до потреб Проекту) належить до **основних задач Керівника Проекту**



- Покращення 2 із 3 параметрів Трикутника може спричини небажаний результат
- Потрібно балансувати всіма 3 параметрами і прагнути наблизитися до «золотої середини»



2 4 Проектний Менеджер



- Хто такий Проектний Менеджер ?
- Як іфункції Проектного Менеджера ?
- За що відповідає Проектний Менеджер ?

2 4 1 Проектний Менеджер. Визначення

«***Особа**, призначена для **керівництва, планування, контролю** та **координації проекту**, а також для **несення відповідальності** за досягнення **цілей проекту** в межах **узгоджених обмежень**.»*

*"**The person** appointed to **lead, plan, control**, and **coordinate the project** and **to be responsible** for achieving the **project objectives** within the **agreed constraints**."*

DIN 69901:2012

«***Особа, відповідальна** за **ведення та керування проектом** з метою досягнення **визначених цілей**, балансування таких обмежень як **обсяг, терміни, витрати, якість** та **ризики**, а також залучення **зацікавлених сторін** та керівництво **проектною командою**.»*

"***A person responsible** for **leading and managing a project** to deliver **defined objectives**, **balancing constraints** such as **scope, time, cost, quality**, and **risk**, while engaging stakeholders and leading the project team."*

IPMA Competence Baseline (ICB) 4.0 (2015)

«***Особа**, призначена організацією-виконавцем для **керівництва проектною командою**, яка **відповідає** за **досягнення цілей проекту**.»*

"***The person** assigned by the performing organization **to lead the project team** that is **responsible** for **achieving the project objectives**."*

PMI - PMBOK Guide 7th edition (2020)

2 4 2 Проектний Менеджер. Функції та Відповідальність

- ✓ **Керівник Проекту / Проектний Манаджер (ПМ) / Project Manager (PM) не повинен знати і вміти всього** у Проекті чи в його контексті (це найчастіше не можливо),
- ✓ Деталі відповіальності **можуть дещо відрізнятися** у конкретних ситуаціях
- ✓ **ПМ повинен**:
  - ✓ **Створити робоче середовище:**
    - ✓ Сформулювати потрібну Команду
    - ✓ Зарезвувати Ресурси
    - ✓ Вибрати Процеси
  - ✓ **Організувати роботу:**
    - ✓ Розподілити Відподвіальність
    - ✓ Сформулювати Завдання та створити структу для їх виконання
  - ✓ **Координувати та контролювати роботу:**
    - ✓ Створити структу для відслідковування та контролю виконання Завдання
    - ✓ Створити структуру відслідковуавння прогресу для досягнення Результату
    - ✓ Узгодити та надавати Звітність у Проекті зацікавленим Учасникам
  - ✓ **Звітувати Поступ** та надавати **Результат** Проекту:
    - ✓ Встановити комунікації із Зацікавленими Сторонами, Керфівництвом
    - ✓ Надавати звітність у погоджений час та у погодженій формі


Діляки відповідальності ПМ'а



2 5 1 Організація. Визначення

- ✓ **Організація / Organization** – у цьому Курсі:
  - ✓ **Компанія**, **Фірма** чи **Установа**, котра **реалізовує Проект**
  - ✓ Підрозділ згаданих Компанії, Фірми, Установи, котрий реалізовує Проект
- ✓ **Проект** часто можна розглядати як **окремий підрозділ Організації** та відповідно описувати взаємодію між ним та самою Організацією

Основні напрямки взаємодії між Організацією та Проектом

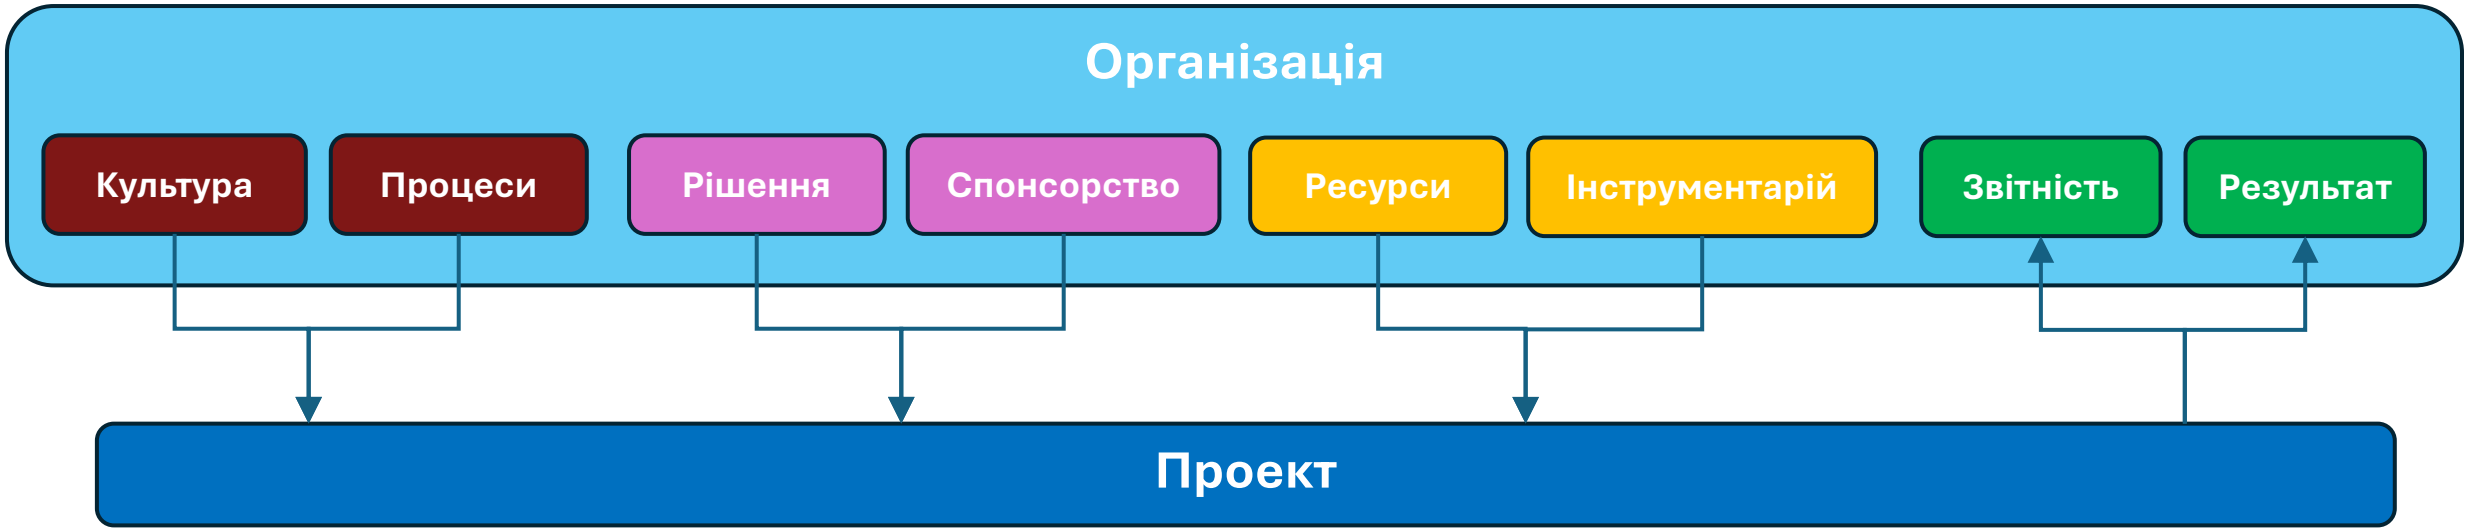

2 5 2 Організація. Процеси та ПМО

- ✓ **Організація / Organization** формує **Процеси, котрі є Стандратами** у межах цієї **Організації**
- ✓ **Процеси** також можуть посилатися на **зовнішні Стандарти**, особливо за потреби **сертифікації**
- ✓ **Процеси** формулюють **правила та обмеження**, котрі необхідно виконувати у Проекті:
  - ✓ Центри та способи **прийняття рішень**
  - ✓ **Ролі** та **Структура** Проекту
  - ✓ **Життєвий Циклу Проекту**: етапи Проекту, пункти Звітності
  - ✓ **Звітність**: Час, спосіб звітності **поступу у Проекті** та надання **Результатів**
  - ✓ **Взаємодія** з іншими **Проектами** та **Підрозділами** Організації, а також з іншими **Організаціями**
  - ✓ **Шаблони** Документів
  - ✓ Інші аспекти
- ✓ Часто за Процеси в Організації відповідає **Проджект Менеджмент Офіс (ПМО) / Project Management Office (PMO)**, котрий загалом виконує такі фукнції:
  - ✓ Розвиток **Філософії**, **Принципів** щодо Керування Проектами в Організації
  - ✓ Формулювання **Процесів Керування Проектами**
  - ✓ **Навчання** Керівників та Учасників Проектів
  - ✓ **Супровід** Проектів, їхній аудит та контроль

26 Філосоція і Цінності




- Що таке Філосфія в Організації ?
- Які Цінності важливі для Організації та Проектів ?
- Чим важливі Філософія і Цінності в умовах чітких процесів та беземоційних завдань ?

2 6 1 Філософія


- ✓ Робоче оточення та правила виконання Проектів побудовані відповідно до **Процесів, Принципів**
- ✓ Процеси та Принципи спираються на **Філософію Організації:**
  - ✓ Це **спосіб дій**
  - ✓ Це дороговказ для **прийняття рішень**
  - ✓ Це **довгосторокове бачення**

Виробнича Система Тойоти

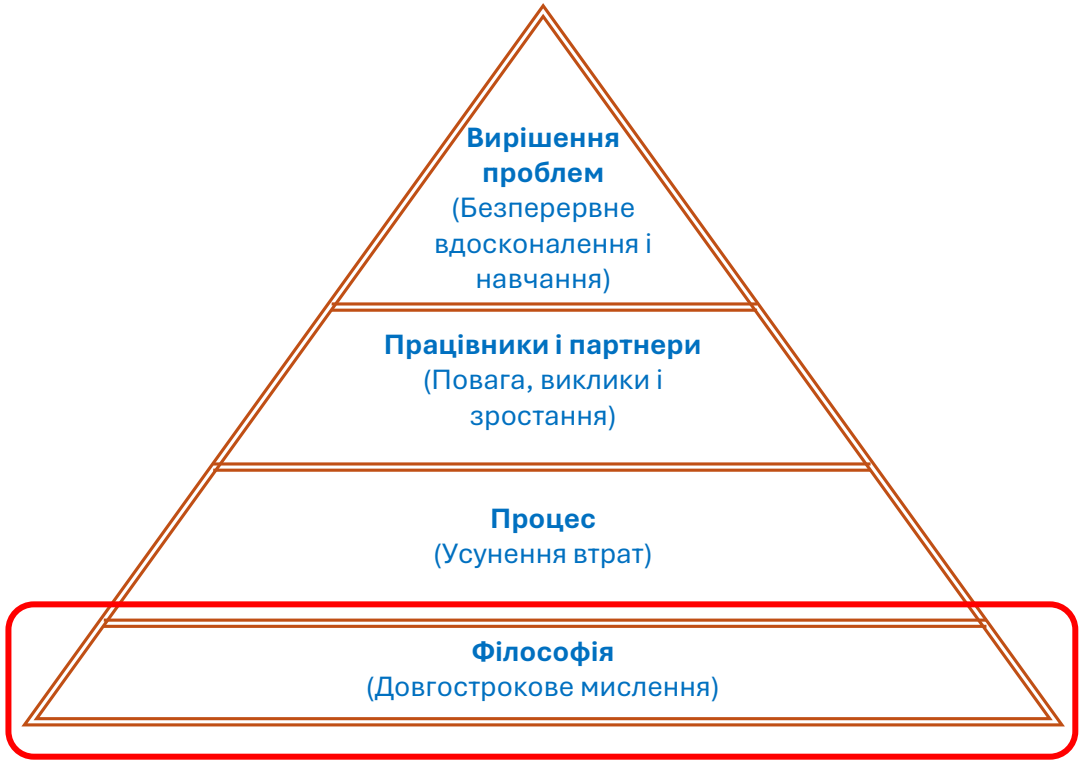

2 6 2 Цінності. Огляд

- ✓ Люди **приймають рішення**, особливо у критичні моменти, **ґрунтуючись на своїх Цінностях**
- ✓ **Організації** будують **довгострокові плани і стратегії**, спираючись на декларовані **Цінності**
- ✓ Важливість **Цінностей**:
  - ✓ Побудова **стабільних взаємовідносин** між людьми в Організації, з уникненням чи вирішенням конфліктів
  - ✓ Визначення **напрямку руху** в довгостороковій перспективі та у критичні моменти

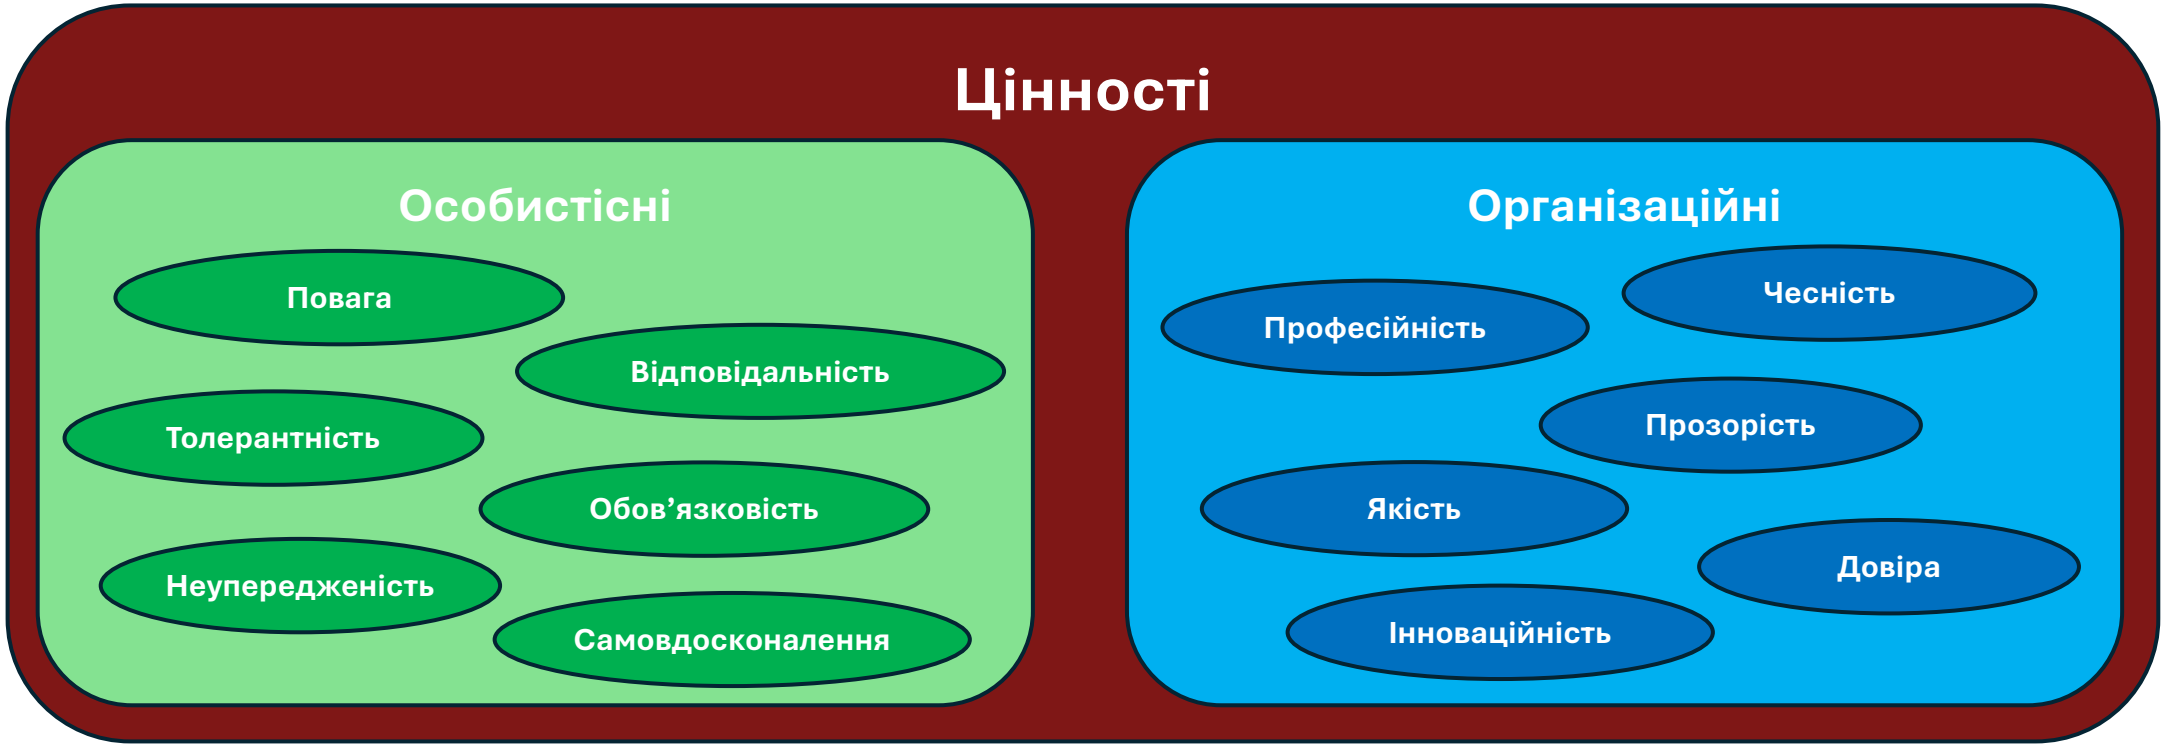

2 6 3 Цінності. Приклади Корпорацій

Основні Цінності Компаній

- **Commitment** – taking ownership and delivering on promises.
- **Open-mindedness** – being respectful, inclusive, and open to new ideas.
- **Trust** – acting with integrity and building reliable relationships.

- Innovation
- Responsibility
- Quality
- Collaboration
- Long-term orientation

1. Accessibility
2. Education
3. Environment
4. Inclusion & Diversity
5. Privacy
6. Racial Equity & Justice
7. Supplier Responsibility

1. Community and Social Responsibility
2. Freedom of Movement
3. Trust and Integrity
4. Innovation and Sustainability
5. Employee Inclusion and Belonging

- Continuous Improvement (Kaizen) relentless pursuit of better ways in every aspect of operations.
- Respect for People strong emphasis on valuing people, fostering teamwork, and maintaining ethical conduct

3 Життєвий Цикл Проекту

1. Класифікація Проектів
2. Визначення
3. Узагальнений Цикл
4. Послідовний Цикл
5. V-Модель
6. Гнучкий Цикл
7. Вибір Життєвого Циклу
8. Звітність. Майлстоуни

3 1 Класифікація Проектів



- Як можна класифікувати Проекти, за якими критеріями ?
- Які типи організації та перебігу Проектів вам відомі ?

3 1 1 Класифікація Проектів. Види


- ✓ Проекти можна класифікувати за багатьма критеріями
- ✓ Тут запропоновано **класифікацію IPMA**
- ✓ **Організація** може вводити **свою класифікацію** відповідно до потреб
- ✓ Курс надалі зосередиться на **Розробницьких Проектах / R&D Projects**




3 1 2 Класифікація Проектів. Підходи

- ✓ **PMI** формулює такі **Підходи / Approaches** (PMBoK Guide v.8):
  - ✓ **Прогностичний / Predictive**:
    - ✓ **Вимоги** визначені на початку Проекту та **залишаються стабільними**;
    - ✓ **Орієнтований на План / Plan Driven**
  - ✓ **Змінний / Adaptive:**
    - ✓ **Вимоги та середовище** Проекту **змінні** у процесі його перебігу, циклічні ітерації створення Продукту
    - ✓ **Орієнтований на Зміни / Changes Driven**
  - ✓ **Гібридний / Hybrid:**
    - ✓ Поєднання Прогностичного та Адаптивного


Приклади перебігу Проектів різних Підходів

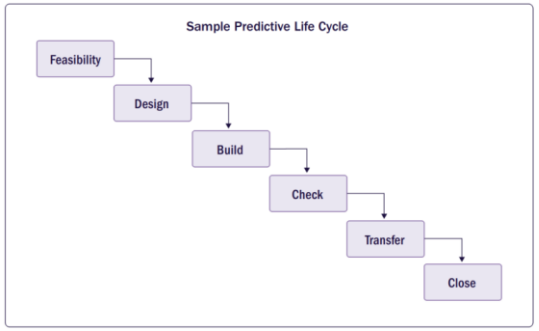

Прогностичний

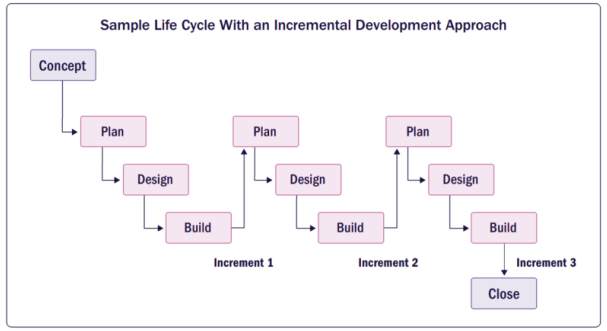

Прогностичний з інкрементальною розробкою

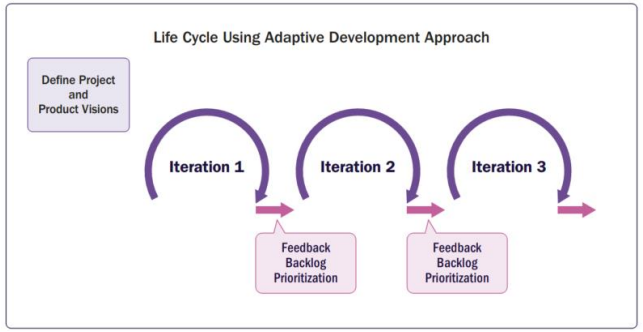


Адаптивний

Джерело: PMI PMBok Guide v.8

❖ Підхід здебільшого визначає спосіб організації та перебіг Проекту

3 2 Життєвий Цикл Проекту. Визначення

- ✓ **Життєвий Цикл Проекту / Project Lifecycle:**
  - ✓ **IPMA:**
    - ✓ *Набір загальноприйнятих **проектних фаз**, котрі утворюють **логічний шлях** від початку проекту до його кінця / The collection of **project phases** generally accepted as creating the project's logical path from its start to its end*
    - ✓ Визначаються **Фази Проекту / Project Phases** відповідно до лоігчної послідовності виконання:



  - ✓ **PMI:**
    - ✓ ***Послідовність фаз**, крізь котрі проходить проект **від свого початку до завершення** / **The series of phases** that a project passes through **from its start to its completion***
    - ✓ *Визначаються **Ділянки Фокусування / Focus Areas** за основними діями, необхідними для Проекту, котрі щоправда не обов'язково повинні виконуватися у поданій послідовності, можуть також перекриватися*



3 3 1 Узагальнений Цикл


- ✓ Подібність дій у Проектах різних підходів дають змогу створити **Узагальнений Життєви Цикл Проекту**, котрий формулює основні Етапи Проекту та дії чи документи, що відповідають цим Етапам
- ✓ Це **приблизна модель** для отримання **загального бачення** основних елементів Проекту в часовому контексті
- ✓ У багатьох випадках **Проект завершується після Етапу-1**, тобто фактично без справжнього початку, коли не було прийнято рішення про реалізацію Проекту
- ✓ Якщо Проект **затверджений і перейшов до Етапу-2**, зазвичай відбуються **усі наступні**




3 4 Послідовний Цикл / Waterfall

Послідовний (Sequential, Waterfall):

- ✓ **Обсяг Проекту / Project Scope** виконується послідоними діями до повної реалізації
- ✓ Проект планується за **Фазами / Phases**, між котрими визначають **Майлстоуни / Milestones**
- ✓ У кожній Фазі можливі **Ітерації** чи **Інкременти** у розробці, тестуванні тощо
- ✓ Проте після завершення Фази її **Обсяг** (Вимоги, Архітектура, Тести тощо) вважається **завершеним і незмінним**

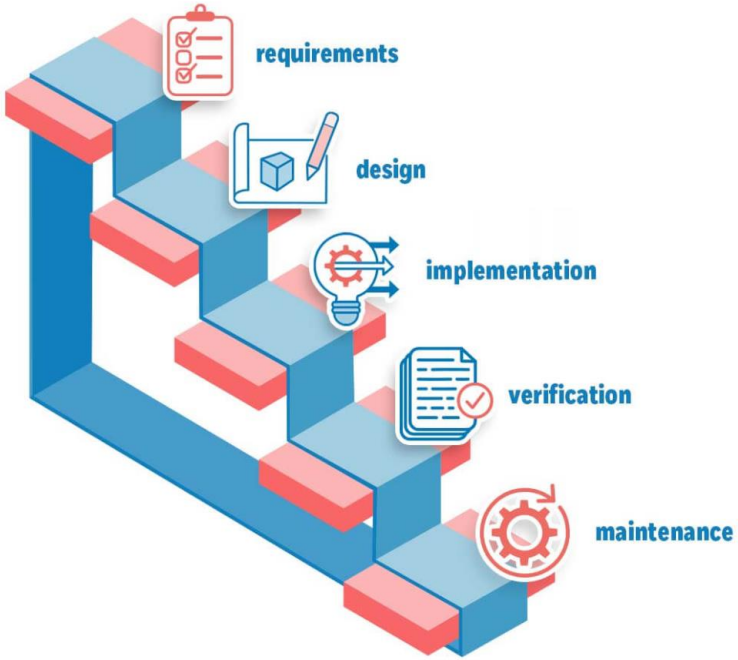

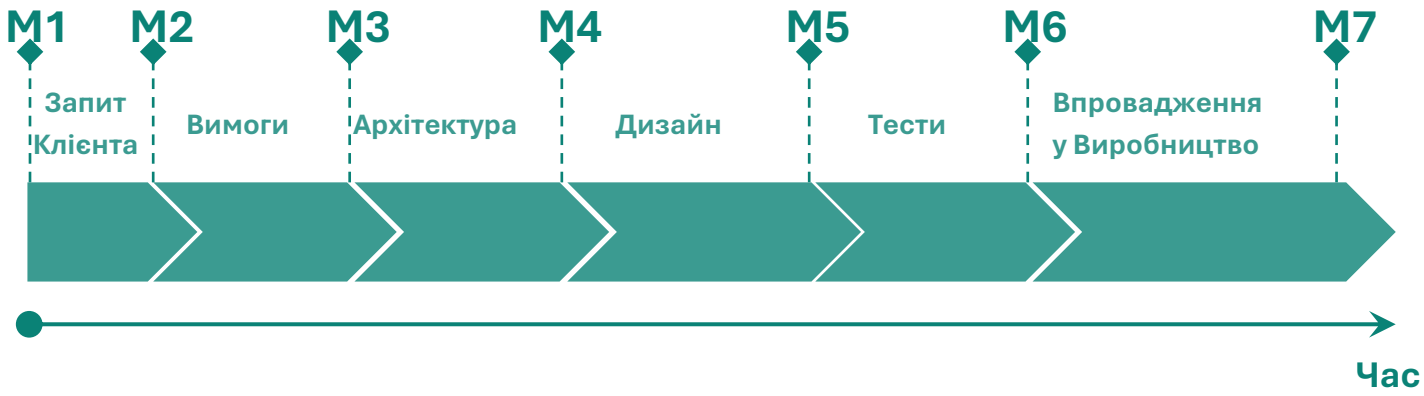


❖ На **верхньому рівні** часто **великі Проекти** (**і Продукти**) розробляються за **Послідовним підходом**, навіть якщо нижче організація інша

3 5 V-Модель / V-Model

V-Модель / V-Model:


- ✓ Виглядає, ніби **«зламаний» Послідовний / Waterfall**
- ✓ Проте має свої дуже корисні характеристики
  - ✓ **Структурованість рівнів** розробки та тестування: Продукт, Архітектура, Компоненти
  - ✓ **Зв'язок між Робочими Продуктамии** через **Простежуваність / Traceability** наступників та попередників: що з чого виникає; що котрі елементи тестує

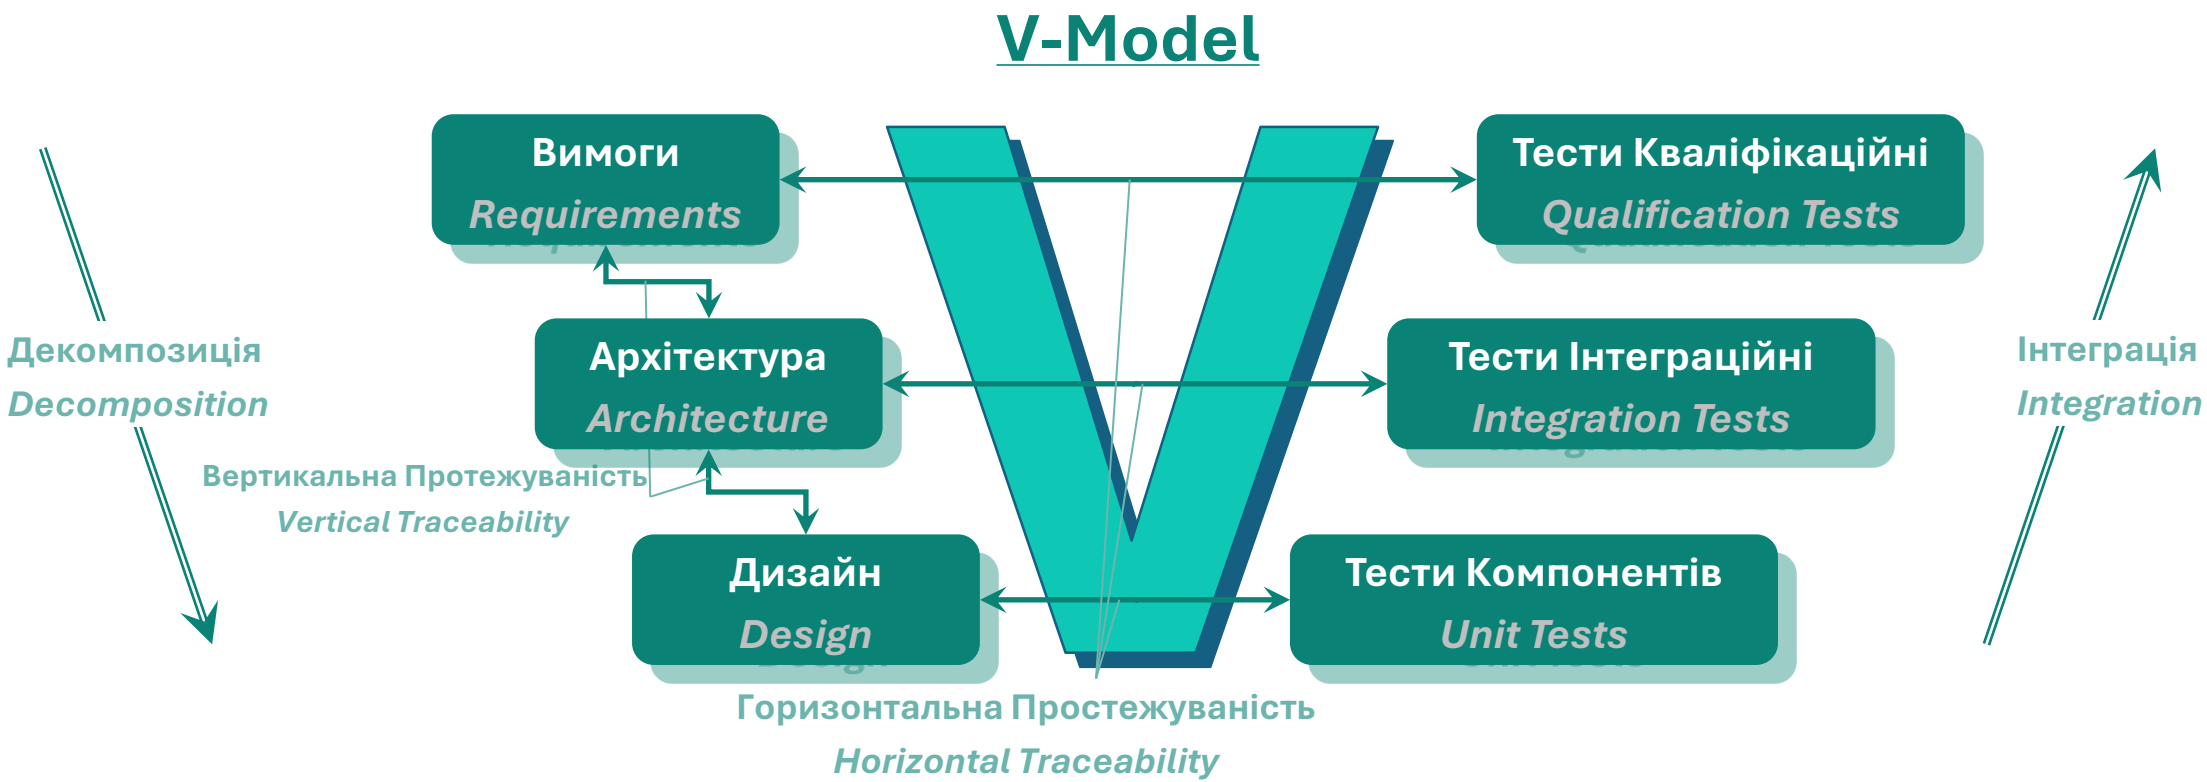


3 6 1 Гнучкий Цикл / Agile

Гнучкий / Agile:

- ✓ Підхід для **змінних умов**, **змінних Вимог**, котрий на перше місце ставить **гнучкість**, **адаптивність**
- ✓ Базуєтьсяна швидких **циклічних діях** та адаптуванні до **змінних Вимог та умов**
- ✓ Перевага віддається **швидкому результату** та **підлаштуванню до Очікувань Клієнта**
- ✓ Визначення дещо суперечать жорстким і **формалізованим підходам** у великих Проектах та компаніях
- ✓ Проте навіть там Гнучкий підхід знаходить застосування, здебільшого **у розробці програм на операційному рівні**

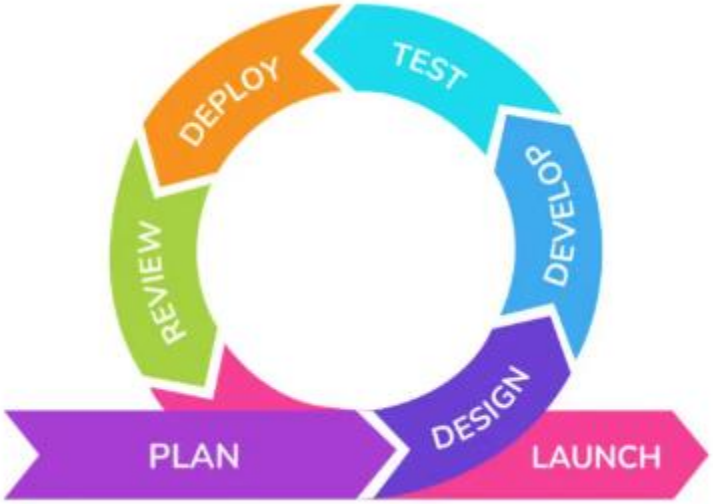


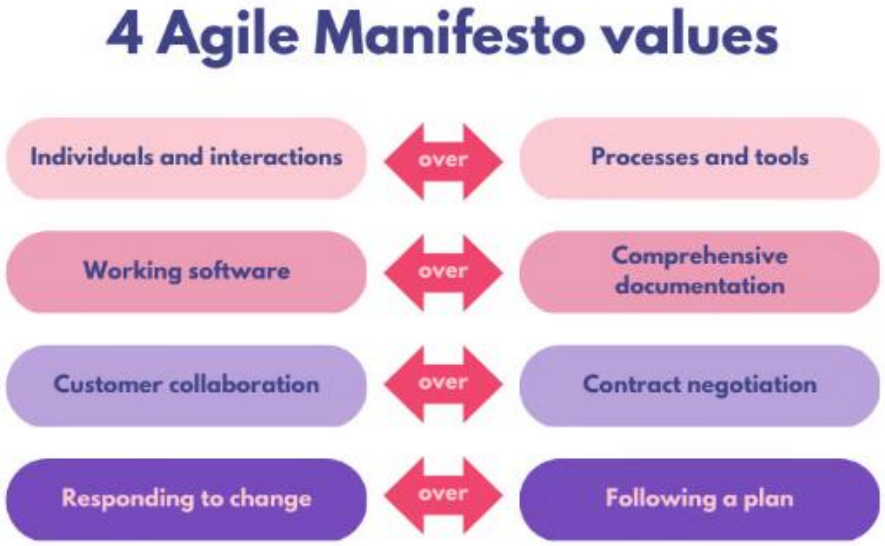


❖ Хоч цей підхід віддає перевагу контактам між учасниками Проекту, миттєвому опрацювання завдань перед формальними процесами, документацією тощо, це **не усуває документацію та процеси із Проекту.**

3 6 2 Гнучкий Цикл / Agile


- ✓ **Agile**, **Scrum** – поширені методології
- ✓ **Гнучкі** та **самоорганізовані** невеликі **Команди**
- ✓ **Інкрементальне** Створення Продукту / **Incremental** Product Development
- ✓ Зосередженість на **робочому продукті**, тоді як Документація може бути спрощеною

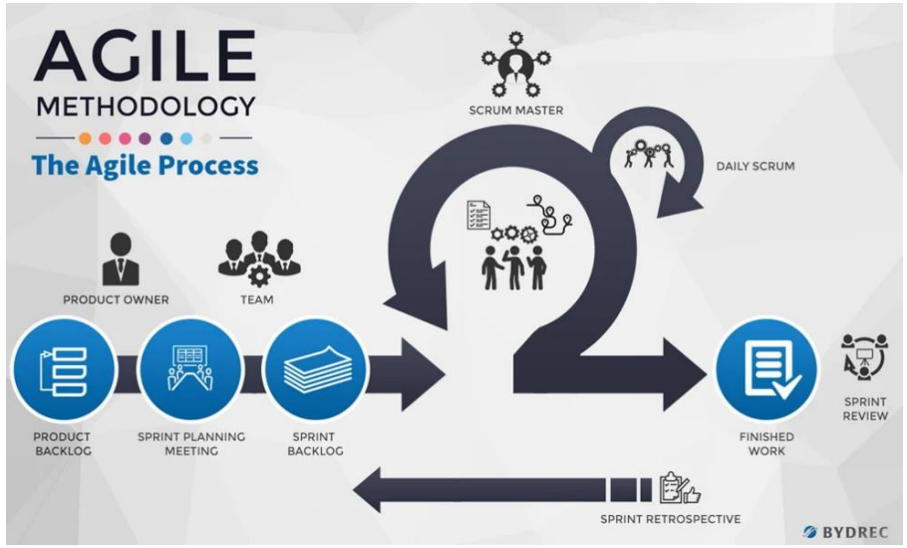

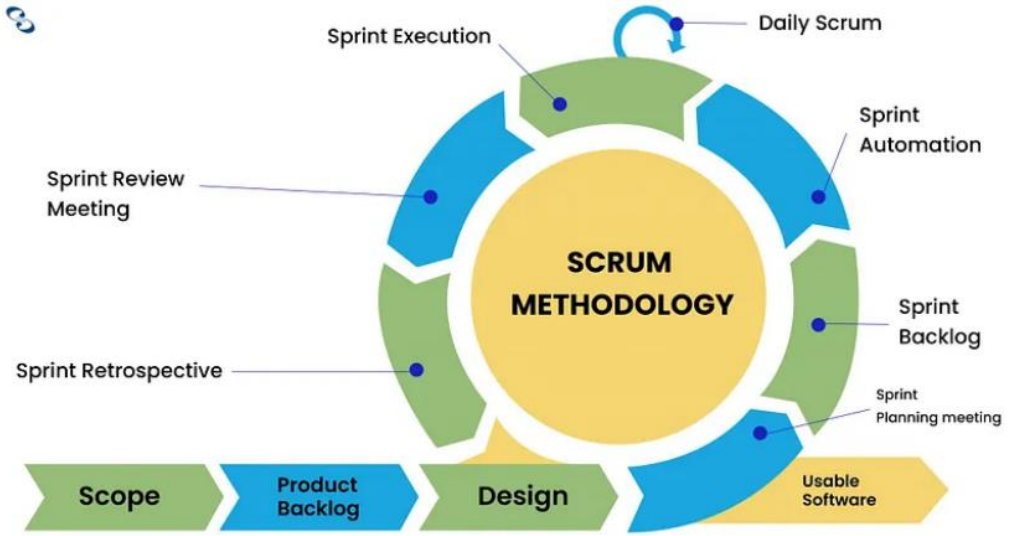

3 6 3 Гнучкий Цикл / Agile

- ✓ **SAFe (Scaled Agile Framework)** застосовується для багаторівневих Програм із понад 100 учасниками
- ✓ Це **масштабування Гнучкого підходу / Agile** до багаторівневої структури
- ✓ **Каскадування** Цілей Проекту / Project Objectives and Goals

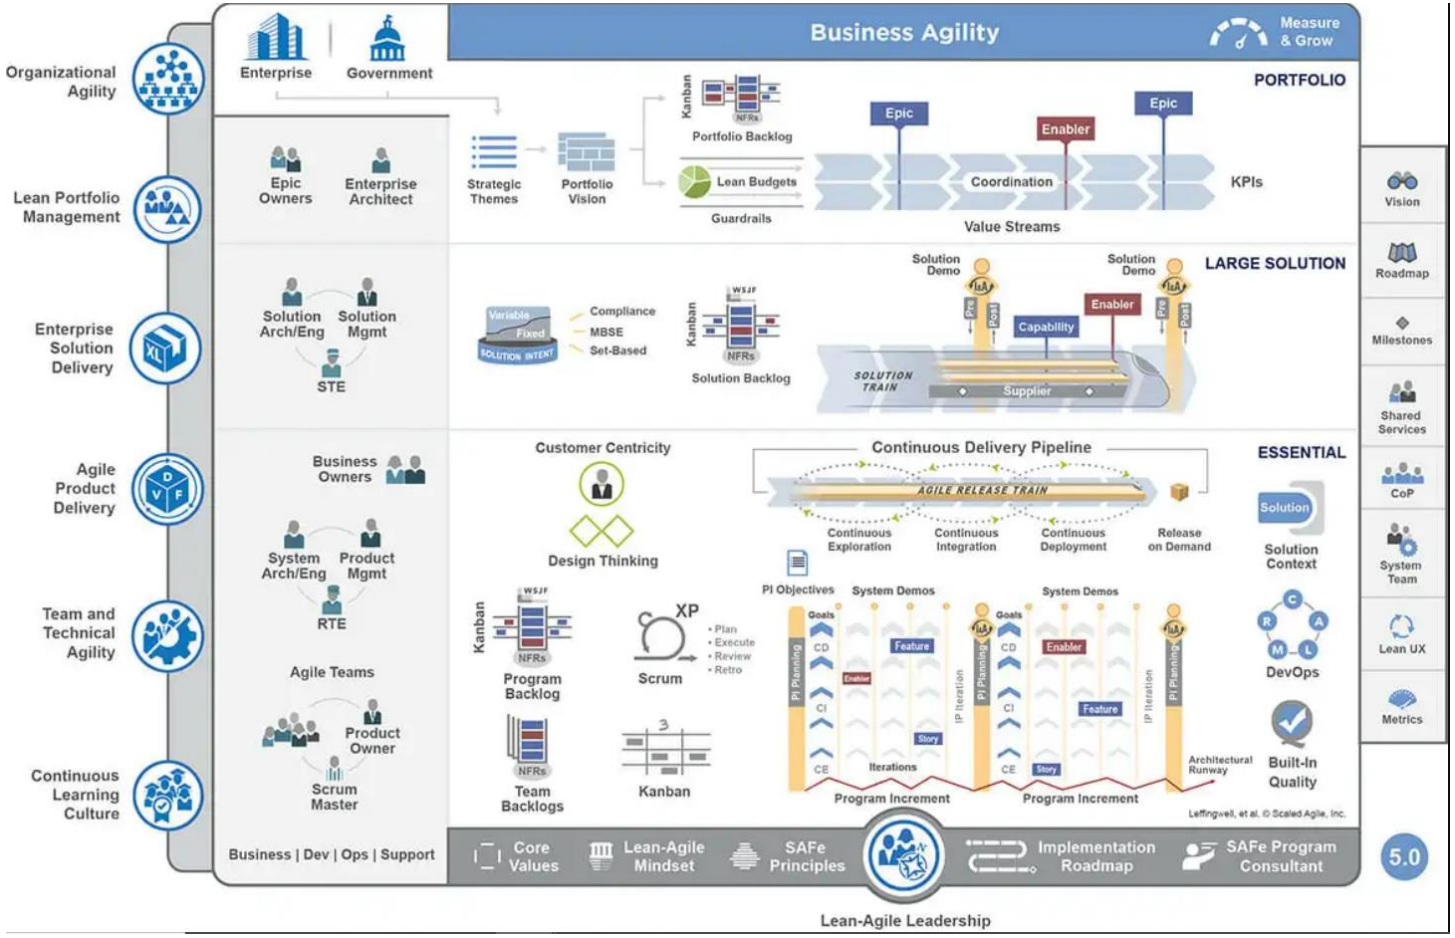


37 Життєвий Цикл Проекту. Вибір Моделі

- ✓ Вибір **Підходу** та **Життєвого Циклу Проекту** потрібно робити у кожному випадку окремо, враховуючи різні чинники:
  - ✓ **Визначеність** та **змінність** Очікувань Клієнта, Вимог та контексту Проекту
  - ✓ **Розмір Проекту**
  - ✓ **Процеси та Культуру Організації**
  - ✓ **Залежність** із іншими Проектами у межах **Програми** чи **Продукту**
- ✓ На практиці часто реалізовано **гібридні Підходи** та **комбіновані Моделі**
- ✓ Типовий приклад в Автомобільній газулі:
  - ✓ Рівень **Організації → Послідовний / Waterfall**
  - ✓ Рівень **Продукту → V-Модель / V-Model**
  - ✓ Рівень **Завдань (Операційний) → Гнучкий / Agile**


Приклад:

Ієрархія Проектів Автомобільної галузі

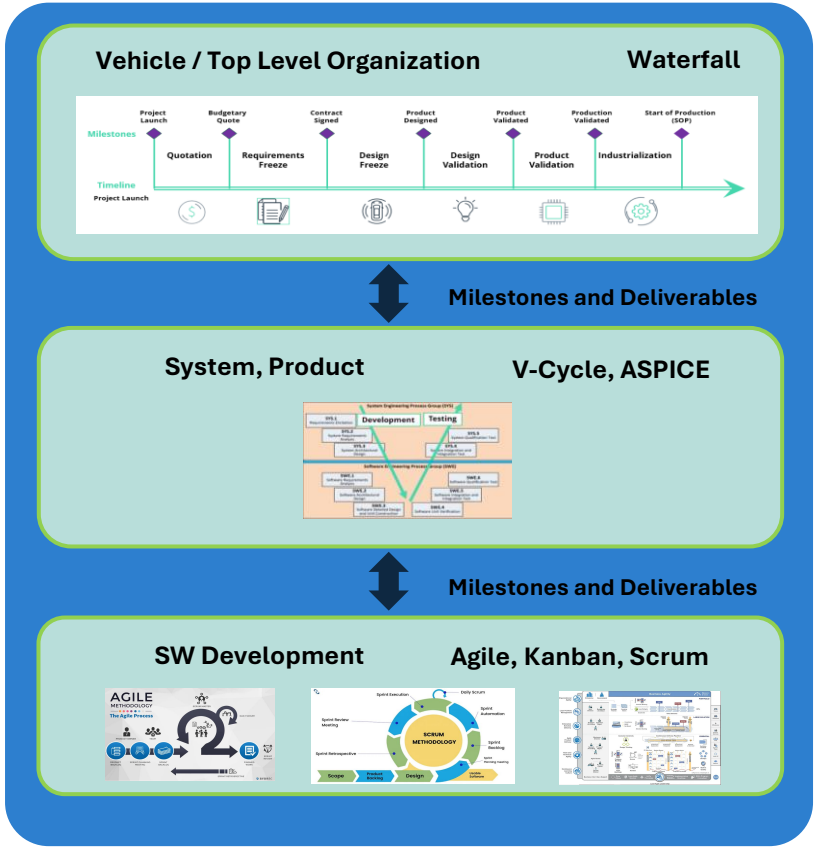

38 Життєвий Цикл Проекту. Майлстоуни

- ✓ Незалежно від вибору моделі Життєвого Циклу, у Проекті зазвичай передбачають **моменти звітності та контролю прогресу – Майлстоуни:**
  - ✓ **Підсумки** певноих Етапів Проекту, у котрих мають бути досягнути проміжні Цілі
  - ✓ **Аудит** з боку Зацікавлених Сторін щодо досягнення проміжних Цілей, визначених наперед
- ✓ Під час Майлстоуну Керівництво розглядає **дозвіл Проектові рухатися далі**, відповідно можуть бути такі результати:
  - ✓ **Затверджено / Pass – Проміжні Цілі досягнуто**, Проект продовжує рухатися за Планом
  - ✓ **Умовно Затверджено / Conditional Pass** – Проект продовжує роботу, проте визначено **обов'зкові виправлення**
  - ✓ **Відхилено / Fail** – Проміжні Цілі не досягнуто, Проект **зупиняється до усунення прогалин**

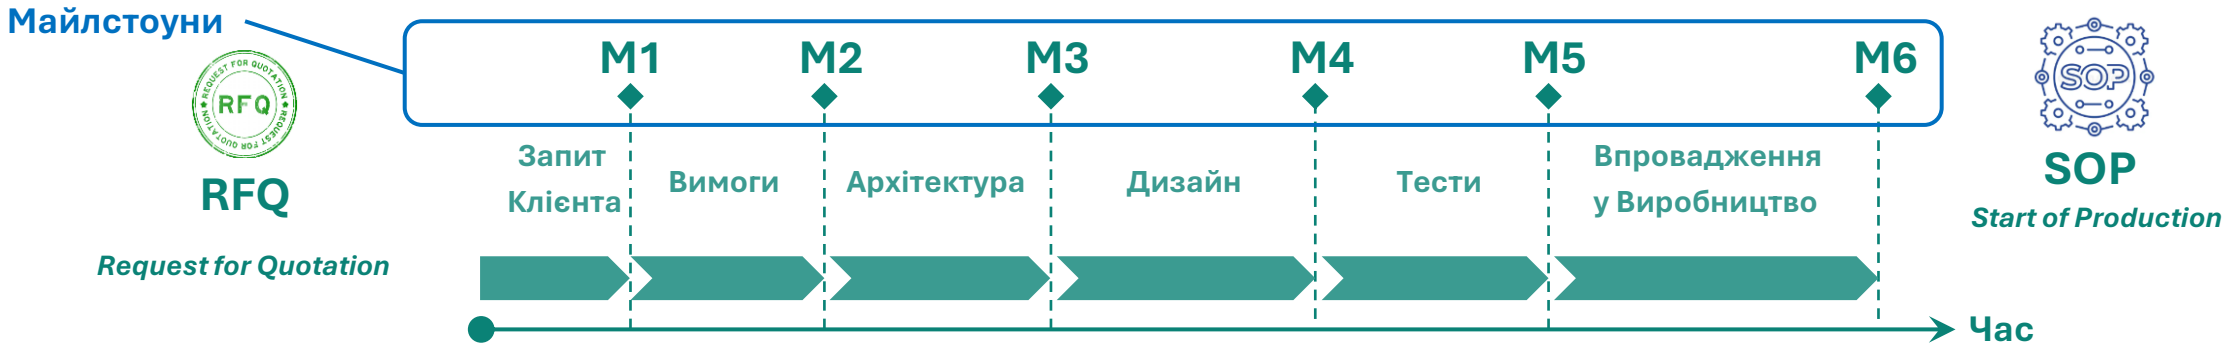

* ***ПМІ Україна*** *подає переклад цього слова як* ***«Віха»****, проте застосування такої форми форма автору ще не зустрічалося*

- ❖ **Майлстоун** – це **звітність та відповідальність ПМ'а**, хоч матеріали подають різні Учасники Проекту
- ❖ Майлстоунами **часто називають Фази / Етапи Проекту**, проте це **неточність у термінології**
- ❖ Організації надають **назви Майлстоунам**, котрі або встановлюють просто послідовність, або є інтуїтивними та відображають Проміжні Цілі: PR1, PR2 etc; Requirements Freeze (REQF), Design Freeze (DESF) etc.

Проектний Менеджмент в IT
Лекція 1

Дякую за увагу ☺
